

# ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA  
Dirección AFTN: LEANZXTA  
Teléfono: +34 913 213 363  
E-mail: ais@enaire.es  
Web: www.enaire.es

ENAIRE  
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA  
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2  
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 136/23  
AIRAC 24-AUG-23

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 05-OCT-23 // EFFECTIVE DATE WEF 05-OCT-23

AD

SUP 136/23

05OCT23/05OCT24EST

SUP 136/23

05OCT23/05OCT24EST

**VALENCIA AD (LEVC).- Instalación torres mega en plataforma sur y zona de instalaciones auxiliares.**

**VALENCIA AD (LEVC).- Installation of mega towers on south apron and auxiliary installations area.**

Hasta el 5 de octubre de 2024 estimado, se estarán realizando obras para reforzar la instalación de torres Mega en la plataforma.

Until 5 October 2024 (estimated), works shall be carried out to consolidate the installation of Mega Towers on the apron.

Las obras se llevarán a cabo en seis fases, divididas en varias subfases, siendo las áreas afectadas en cada una de ellas las que se reflejan en el presente documento.

The works shall be conducted in two phases, divided into several sub-phases, and the areas affected in each are those specified in this document.

La ejecución de las fases no necesariamente deberá realizarse en el orden expuesto y se podrán activar varias fases o subfases simultáneamente. Las fechas de inicio y fin, las horas de inicio y fin del horario diurno, así como cualquier incidencia operativa se publicarán mediante el correspondiente NOTAM.

The phases may not necessarily be executed in the order defined, and several phases or sub-phases may be activated simultaneously. The start and end dates, the start and end times for daylight schedule, as well as any operational incident, will be published by the corresponding NOTAM.

Todas las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas. Se recomienda precaución debido a la posible presencia de personal y maquinaria.

All work areas shall be duly marked and lit. Caution is recommended due to the possible presence of personnel and machinery.

Por seguridad operacional, el izado de los fustes de las torres Mega se realizarán en horario nocturno en ventanas sin operaciones de aeronaves.

For operational safety reasons, the shafts of the Mega Towers shall be hoisted at night time in windows without aircraft operations.

En las fases 1.A y 2.A, con el cierre de W15, se verán afectadas las rutas de rodaje por la plataforma sur. En el caso de helicópteros con rodaje aéreo, en algunos casos deberán realizar el rodaje con viento en cola.

In phases 1.A and 2.A, the closure of W15 shall affect taxiing routes on the south apron. In the case of air taxiing helicopters, in some cases they must taxi with a tailwind.

**FASE 0: Trabajos de implantación, replanteo y toma de datos en plataforma SUR.**

**PHASE 0: Implementation, stakeout and data collection on the SOUTH apron.**

**Horario:** Diurno.

**Schedule:** Daytime

**Restricciones operativas:** Sin restricciones operativas.

**Operational Restrictions:** No operational restrictions.

**FASE 1: Actuaciones para instalación de Torre S-12.**

**PHASE 1: Actions for the installation of Tower S-12.**

**FASE 1A: Obra civil.**

**PHASE 1A: Civil engineering works.**

**Ubicación:** PRKG 137, 138, 139 y 145. TWY W15.

**Location:** PRKG 137, 138, 139 and 145. TWY W15.

**Horario:** Diurno. Este horario podrá ampliarse a H24 por necesidades de producción u operativas del aeropuerto.

**Schedule:** Daytime. This schedule may be extended to 24H due to the airport's production or operational requirements.


**Restricciones operativas:**

**Operational Restrictions:**

1. Cierre de PRKG 137, 138, 139 y 145.
2. Corte de TWY W15 entre los PRKG 139 y 145.
3. Modificación de ruta de acceso de RFFS al PRKG 153 pasando por la TWY W13.

1. Closure of PRKG 137, 138, 139 and 145.
2. TWY W15 cut off between PRKG 139 and 145.
3. Modification of RFFS access route to PRKG 153 passing through TWY W13.

FASE // PHASE 1A

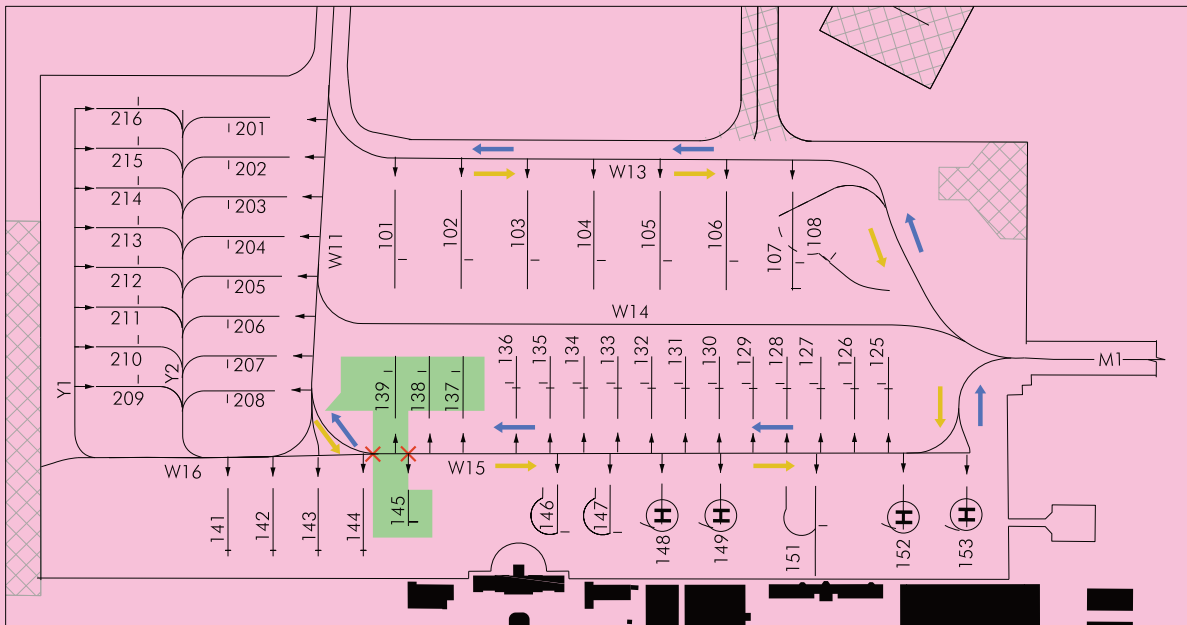

- ⊠ ZONA NO UTILIZABLE // AREA NOT USABLE
- ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA
- ➡ RUTA DE ENTRADA TEMPORAL A LOS PRKGS // TEMPORARY ENTRY ROUTE TO THE STANDS
- ➡ RUTA DE SALIDA TEMPORAL DE LOS PRKGS // TEMPORARY EXIT ROUTE OF THE STANDS
- ✗ TWY CLSD

FASE 1B: Izado e instalación de torre.

Ubicación: PRKG 137, 138 y 139.

Horario: H24. Los trabajos con afectación operativa se adaptarán a ventanas sin operaciones de aeronaves.

Restricciones operativas: Cierre de PRKG 137, 138 y 139.


PHASE 1B: Tower hoisting and installation.

Location: PRKG 137, 138 and 139.

Schedule: H24. Works with operational impact shall be scheduled in windows without aircraft operations.

Operational Restrictions: Closure of PRKG 137, 138 and 139.

FASE // PHASE 1B

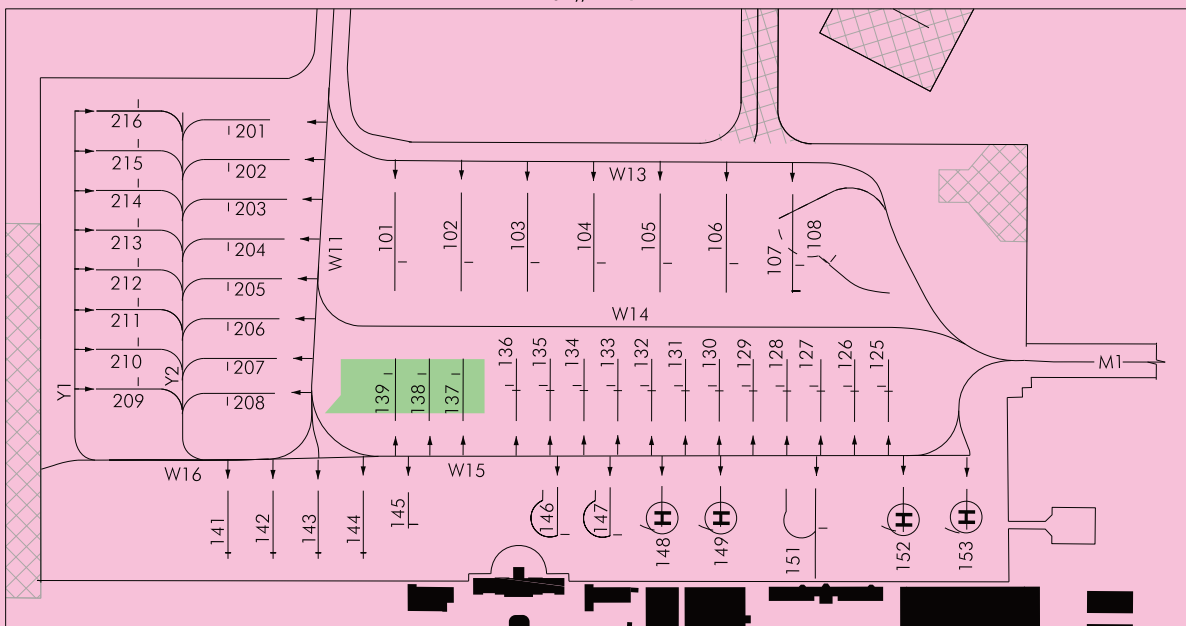

- ⊠ ZONA NO UTILIZABLE // AREA NOT USABLE
- ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA

**FASE 2: Actuaciones para instalación de Torre S-13.**

**PHASE 2: Actions for the installation of Tower S-13.**

**FASE 2A: Obra civil.**

**Ubicación:** PRKG 129, 130, 131 y 149. TWY W15.

**Horario:** Diurno. Este horario podrá ampliarse a H24 por necesidades de producción u operativas del aeropuerto.

**Restricciones operativas:**

1. Cierre de PRKG 129, 130, 131 y 149.
2. Corte de TWY W15 entre los PRKG 130 y 149.  
Modificación de ruta de acceso de RFFS al PRKG 153 pasando por la TWY W13.
3. Acompañamiento por SPP disponible desde el PRKG 125 al 135.


**PHASE 2A: Civil engineering works.**

**Location:** PRKG 129, 130, 131 and 149. TWY W15.

**Schedule:** Daytime This schedule may be extended to 24H due to the airport's production or operational requirements.

**Operational Restrictions:**

1. Closure of PRKG 129, 130, 131 and 149.
2. TWY W15 cut off between PRKG 130 and 149.  
Modification of RFFS access route to PRKG 153 passing through TWY W13.
3. Stand accompaniment by SPP available from PRKG 125 to 135.

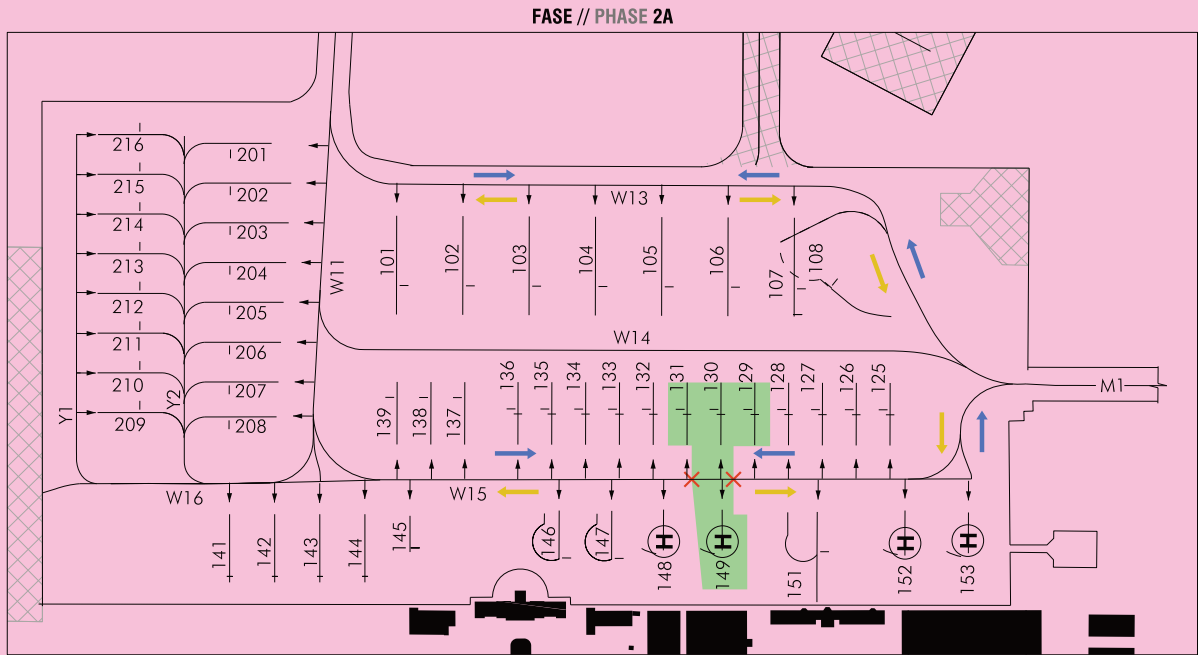

- ⊠ ZONA NO UTILIZABLE // AREA NOT USABLE
- ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA
- ➡ RUTA DE ENTRADA TEMPORAL A LOS PRKGS // TEMPORARY ENTRY ROUTE TO THE STANDS
- ➡ RUTA DE SALIDA TEMPORAL DE LOS PRKGS // TEMPORARY EXIT ROUTE OF THE STANDS
- ✗ TWY CLSD

**FASE 2B: Izado e instalación de torre.**

**Ubicación:** PRKG 129, 130 y 131.

**Horario:** H24. Los trabajos con afectación operativa se adaptarán a ventanas sin operaciones de aeronaves.

**Restricciones operativas:** Cierre de PRKG 129, 130 y 131.


**PHASE 2B: Tower hoisting and installation.**

**Location:** PRKG 129, 130 and 131.

**Schedule:** H24. Works with operational impact shall be scheduled in windows without aircraft operations..

**Operational Restrictions:** Closure of PRKG 129, 130 and 131.

FASE // PHASE 2B

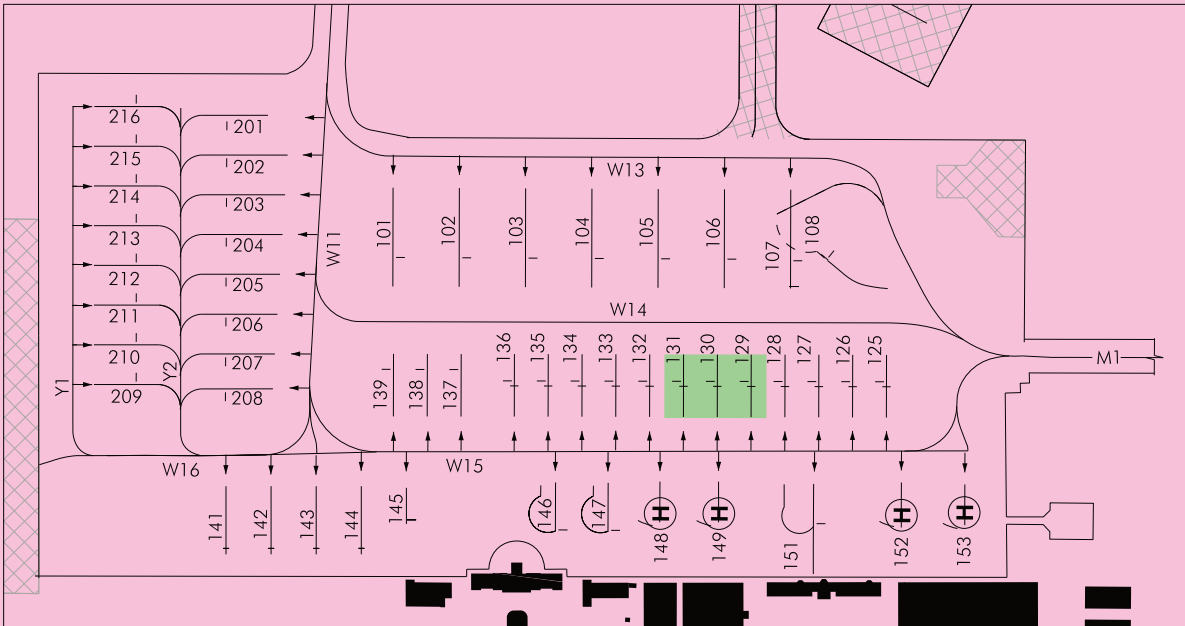

- ZONA NO UTILIZABLE // AREA NOT USABLE
- ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA

**FASE 3: Actuaciones en Torres S-8 a S-11.**

**Ubicación:** Zona al norte de la APN paralela a la TWY W13 y puerta F.

**Horario:** H24. Los trabajos con afectación operativa se adaptarán a ventanas sin operaciones de aeronaves..

**Restricciones operativas:** Sin restricciones operativas. Los trabajos con posible afectación operativa se adaptarán a ventanas sin operaciones de aeronaves.

En caso de que opere una aeronave no prevista, se avisará al personal para que se retire de la zona afectada en el proceso de entrada y salida de la aeronave.

**PHASE 3: Actions on Towers S-8 to S-11.**

**Location:** Area to the north of the APN parallel to TWY W13 and Gate F.

**Schedule:** H24. Works with operational impact shall be scheduled in windows. without aircraft operations.

**Operational Restrictions:** No operational restrictions. Works with possible operational impact shall be scheduled in windows without aircraft operations.

In the event of an unscheduled aircraft operation, the personnel shall be notified so they may withdraw from the affected area during the aircraft entry and exit.

FASE // PHASE 3



- ZONA NO UTILIZABLE // AREA NOT USABLE
- ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA

**FASE 4: Resto de actuaciones.**

**Ubicación:** Isletas Torres Mega, CT-2, Plataforma.

**Restricciones operativas:** Sin restricciones operativas.

**PHASE 4: Other actions.**

**Location:** Mega Towers Islets, CT-2, Apron.

**Operational Restrictions:** No operational restrictions.

**FASE 5: Retirada y limpieza.**

**Ubicación:** Torres Mega, Plataforma, ZIA (Zona de instalaciones auxiliares).

**Restricciones operativas:** Sin restricciones operativas.

**PHASE 5: Removal and clean-up.**

**Location:** Mega Towers, Apron, ZIA (Auxiliary facilities area/Zone).

**Operational Restrictions:** No operational restrictions.

**INTENCIONADAMENTE EN BLANCO**  
**INTENTIONALLY BLANK**
