

AIS-ESPAÑA
 Dirección AFTN: LEANZXTA
 Teléfono: +34 913 213 363
 E-mail: ais@enaire.es
 Web: www.enaire.es

ENAIRE
 DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
 Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
 P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 164/23
 AIRAC 21-SEP-23

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 02-NOV-23 // EFFECTIVE DATE WEF 02-NOV-23

AD

SUP 164/23

02NOV23/02NOV24EST

ALMERÍA AD (LEAM).- Obras de ampliación del área de seguridad de extremo RWY 07 y corrección de márgenes de seguridad de calles de rodaje.

Hasta el 02 de noviembre de 2024 estimado, se estarán realizando obras para la adecuación de las TWY T2 y T3 en su encuentro con la puerta de acceso a plataforma D y la ampliación de la RESA 07.

Las obras se llevarán a cabo en tres fases, divididas en varias subfases, siendo las áreas afectadas en cada una de ellas las que se reflejan en el presente documento.

La ejecución de las fases deberá realizarse en el orden expuesto y se podrán activar varias fases o subfases simultáneamente.

Las fechas de inicio y fin de cada fase y subfase, así como cualquier incidencia operativa se publicarán mediante el correspondiente NOTAM.

Todas las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas. Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

Los trabajos en todas las fases de obra que lo requieran se realizarán cerrando elementos del campo de vuelos y salvaguardando las pertinentes distancias de seguridad respecto al resto de infraestructuras que permanezcan operativas.

FASE 0: IMPLANTACIÓN Y TOMA DE DATOS.

Descripción de los trabajos:

Se realizarán en horario diurno.

Restricciones operativas:

Sin restricciones operativas.

FASE 1. ACTUACIONES EN CALLES DE RODAJE.

Subfase 1.1 Actuaciones en TWY T2.

Descripción de los trabajos:

Se realizarán en horario nocturno.

Comienzan los trabajos en el área de maniobras. En esta subfase tendrán lugar las actuaciones referentes a la adecuación de los giros de las aeronaves de letra de clave D en la TWY T2. Para ello se ejecutará un sobreancho del pavimento actual tanto de calle de rodaje como de borde.

Restricciones operativas:

La GATE D permanecerá cerrada al tráfico por escalón en franja.

La TLOF quedara suspendida.

SUP 164/23

02NOV23/02NOV24EST

ALMERÍA AD (LEAM).- Works to expand the RWY 07 end safety area and to correct taxiway safety margins.

Until 02 November 2024 (estimated), refurbishment works of TWY T2 and T3 where they meet the access gate to strip D and the expansion of RESA 07 will be under way.

The work will take place in three phases, divided into several subphases, and the areas affected in each are those specified in the present document.

The phases might necessarily be executed in the order defined, and several phases or subphases might be activated simultaneously.

The start and end dates of each phase and subphase, as well as any operational incident, will be by the corresponding NOTAM.

All phases of the works will be duly marked and lit. Caution is recommended due to the presence of personnel and machinery.

As and when required in all phases, the works will be conducted by closing off airfield elements and maintaining the relevant safety distances from other infrastructures that remain operational.

PHASE 0: IMPLEMENTATION AND DATA COLLECTION.

Description of the works:

They will be carried out at daytime.

Operational Restrictions:

No operational restrictions

PHASE 1. ACTIONS ON TAXIWAYS.

Subphase 1.1 Actions on TWY T2.

Description of the works:

They will take place at night time.


Works will commence in the manoeuvring area. In this subphase, actions to adapt the taxiway for turns by code letter D aircraft at TWY T2 will take place. To this end, the existing pavement will be widened, both on the taxiway and on the edges.

Operational Restrictions:

GATE D will be closed to traffic due to uneven height of strip.

The TLOF will be suspended.

SUBFASE // SUBPHASE 1.1

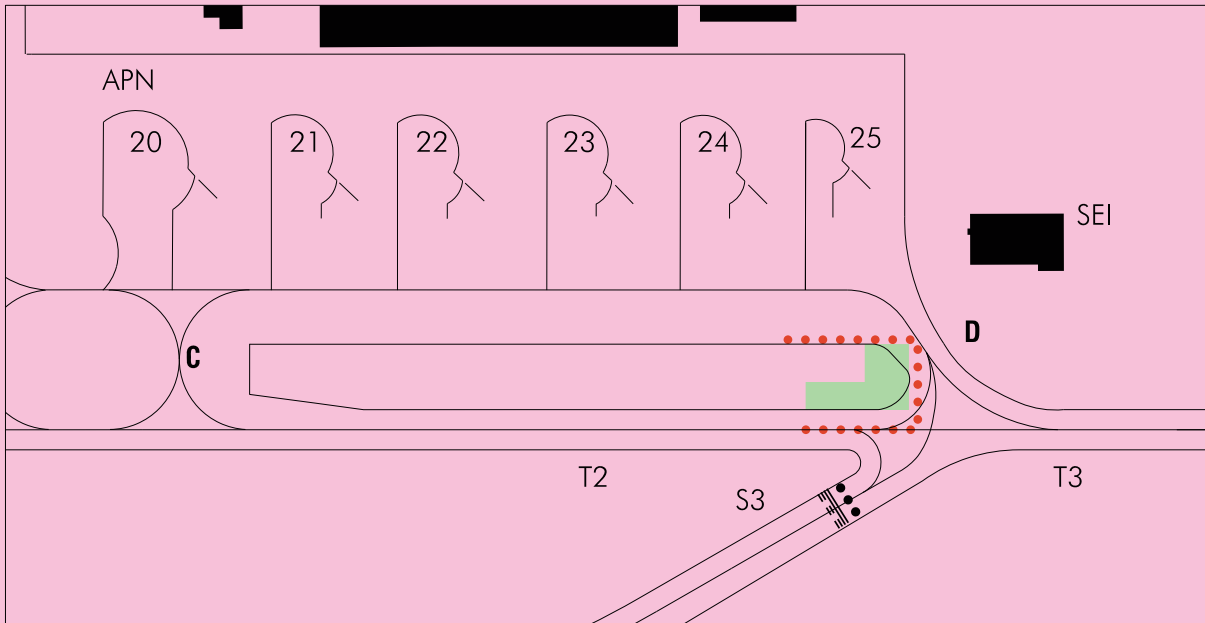

- ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA
- CONOS DE BALIZA LUMINOSA // LIGHT BEACON CONES

Subfase 1.2 Actuaciones en TWY T3.

Descripción de los trabajos:

Se realizarán en horario nocturno.

Los trabajos comenzarán en el área de maniobras. En esta subfase tendrán lugar las actuaciones referentes a la adecuación de los giros de las aeronaves de letra de clave E en la TWY T3. Para ello se ejecutará un sobrecorte del pavimento actual tanto de calle de rodaje como de borde.

Restricciones operativas:

La GATE D permanecerá cerrada al tráfico por escalón en franja.

La TLOF quedara suspendida.

Subphase 1.2 Actions on TWY T3.

Description of the works:

They will take place at night time.


Works will commence in the manoeuvring area. In this subphase, actions to adapt the taxiway for turns by code letter E aircraft at TWY T3 will take place. To this end, the existing pavement will be widened, both on the taxiway and on the edges.

Operational Restrictions:

GATE D will be closed to traffic due to uneven height of strip.

The TLOF will be suspended.

SUBFASE // SUBPHASE 1.2

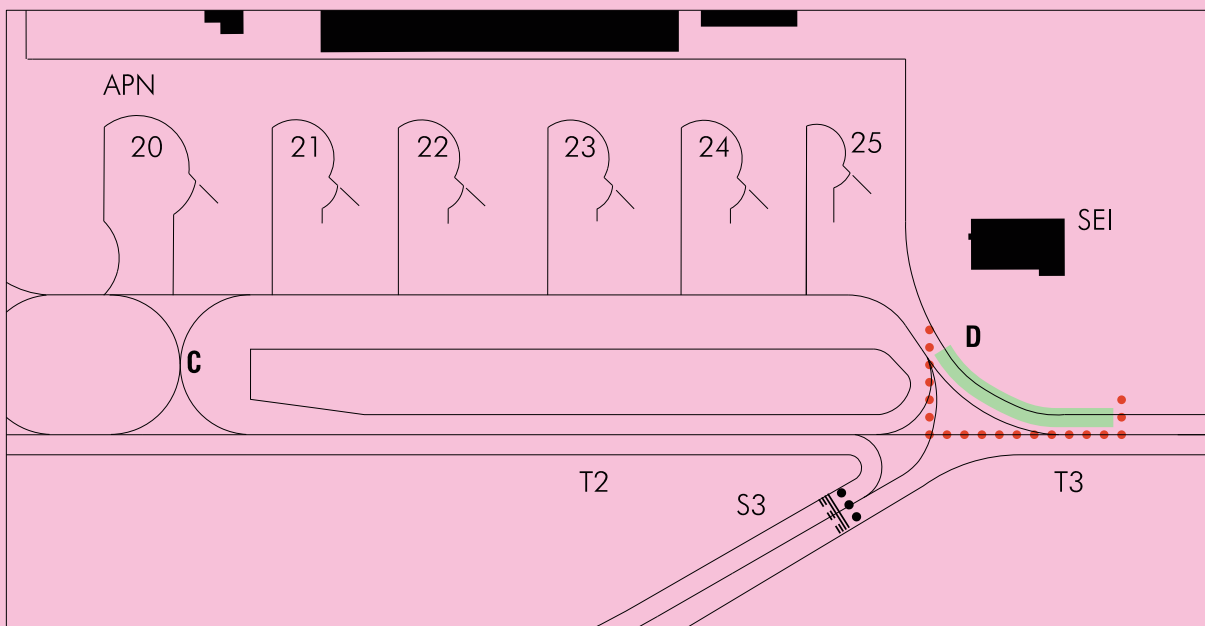

- ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA
- CONOS DE BALIZA LUMINOSA // LIGHT BEACON CONES

Subfase 1.3 Pavimentación definitiva de las TWY 2 y 3, y repintado de eje de acceso al PRKG 20.

Descripción de los trabajos:

Se realizarán en horario nocturno.

Se ejecutarán en esta subfase los trabajos de pavimentación de las TWY T2 y T3, y el repintado del eje de acceso al PRKG 20.

Restricciones operativas:

La GATE D permanecerá cerrada al tráfico por escalón en franja.

La TLOF quedara suspendida.

Subphase 1.3 Final paving of TWY 2 and 3, and repainting of the centre line access to PRKG 20.

Description of the works:

They will take place at night time.


Works for the paving of TWY T2 and T3 will be carried out in this subphase, and repainting of the centre line access to PRKG 20.

Operational Restrictions:

GATE D will be closed to traffic due to uneven height of strip.

The TLOF will be suspended.

SUBFASE // SUBPHASE 1.3

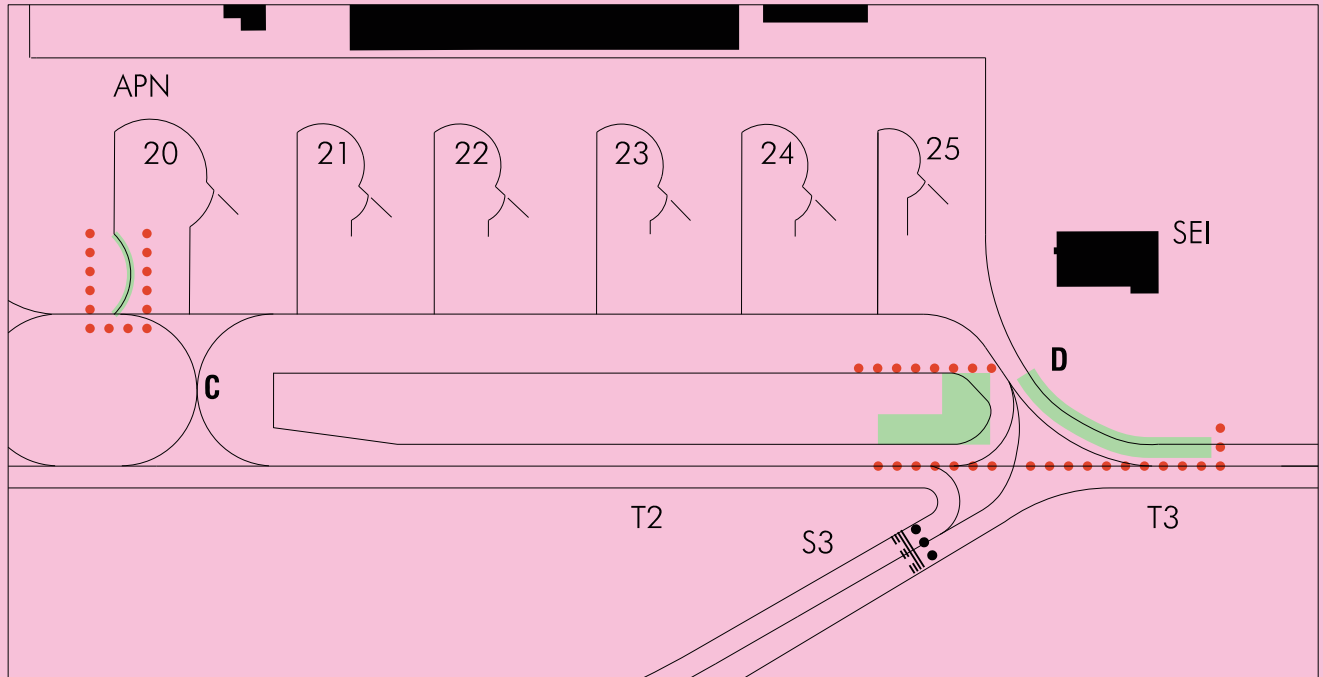

■ ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA

●●● CONOS DE BALIZA LUMINOSA // LIGHT BEACON CONES

FASE 2. AMPLIACIÓN RESA 07.

Descripción de los trabajos:

En esta fase tendrá lugar las actuaciones referentes a la adecuación de las dimensiones de la RESA 07 a las recomendaciones de la normativa. Esta fase se divide en dos subfases, dependiendo de la ubicación de los trabajos.

Subfase 2.1. Trabajos fuera de los límites del aeropuerto.

Descripción de los trabajos:

Se realizarán en horario diurno.

Esta subfase recoge las actuaciones que se realizan fuera del vallado perimetral en referencia a la ampliación de las dimensiones de la RESA.

Restricciones operativas:

Sin restricciones operativas.

PHASE 2. RESA 07 EXPANSION.

Description of the works:

In this phase, actions to adapt the dimensions of RESA 07 to those recommended by the regulations will take place. This phase is divided into two subphases, depending on the location of the works.

Subphase 2.1. Work outside the airport boundaries.

Description of the works:


They will take place at daytime.

This subphase includes the actions executed outside the perimeter fence in order to expand the dimensions of the RESA.

Operational Restrictions:

No operational restrictions.

SUBFASE // SUBPHASE 2.1

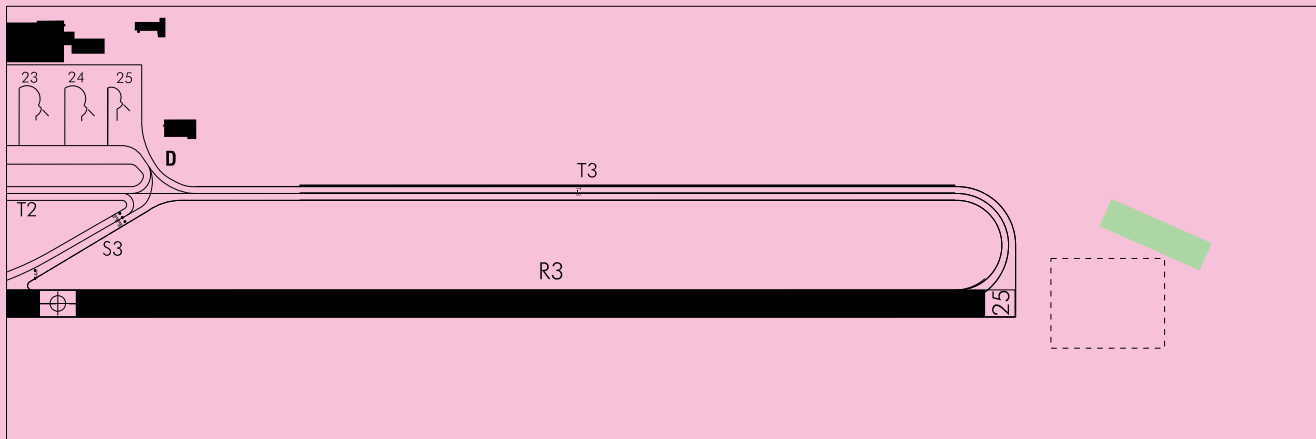

■ ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA

Subfase 2.2. Trabajos dentro de los límites del aeropuerto.

Descripción de los trabajos:

Se realizarán en horario nocturno.

Esta subfase recoge las actuaciones que se realizan dentro del vallado perimetral en referencia a la ampliación de las dimensiones de la RESA.

Restricciones operativas:

Sin restricciones operativas.

Subphase 2.2. Work inside the airport boundaries.

Description of the works:


They will take place at night time.

This subphase includes the actions executed inside the perimeter fence in order to expand the dimensions of the RESA.

Operational Restrictions:

No operational restrictions.

SUBFASE // SUBPHASE 2.2

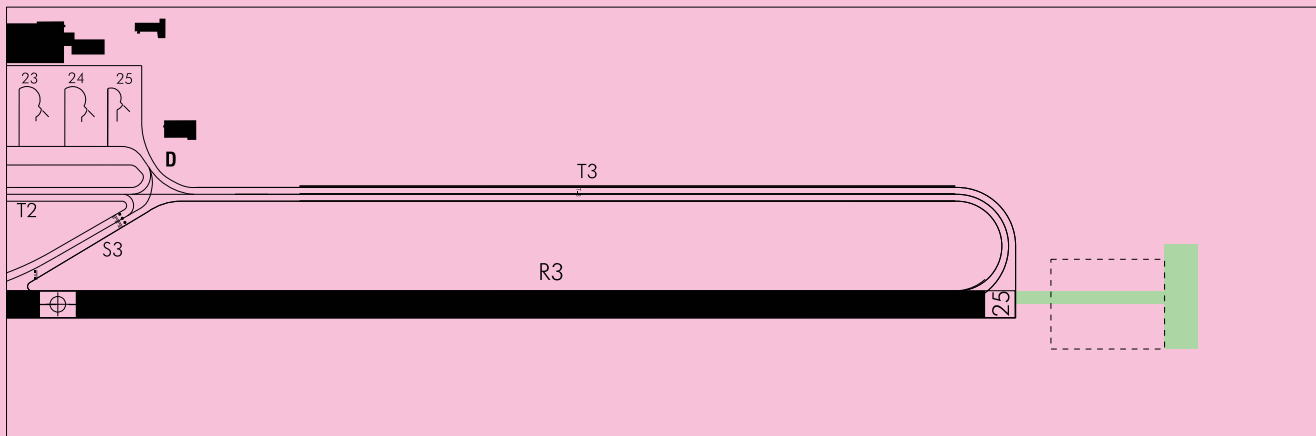

■ ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA

FASE 3. DESACTIVACIÓN DE OBRA.

Descripción de los trabajos:

Desmantelamiento de las instalaciones auxiliares, remates, retirada del campamento de obra, limpieza y recepción final de la obra.

Restricciones operativas:

Sin restricciones operativas.

PHASE 3. DEACTIVATION OF THE WORKS.

Description of the works:

Dismantling auxiliary installations, finishing touches, dismantling the construction site, cleaning and final handover of the works.

Operational Restrictions:

No operational restrictions.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK
