

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 172/24
AIRAC 19-SEP-24

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 31-OCT-24 // EFFECTIVE DATE WEF 31-OCT-24

AD

SUP 172/24 31OCT24/31OCT25EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

MENORCA AD (LEMH).- Obras de pavimentación en plataforma.

Hasta el 31 de octubre 2025 estimado, se realizarán obras de renovación del pavimento en la plataforma de aviación comercial del Aeropuerto de Menorca.

Las obras se llevarán a cabo en cuatro fases. Las fechas efectivas de inicio y fin de cada fase, así como cualquier incidencia operativa que se produzca, se anunciarán mediante el correspondiente NOTAM.

Todas las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas, recomendándose precaución debido a la presencia en horario operativo de personal y maquinaria.

No se realizarán trabajos cuando estén activados los procedimientos de visibilidad reducida.

SUP 172/24 31OCT24/31OCT25EST

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

MENORCA AD (LEMH).- Pavement works on the apron.

Until 31 October 2025 (estimated), works to resurface the commercial aviation apron of Menorca Airport will be underway.

The works will be carried out in four phases. The effective start and end dates of each phase, as well as any operational incidents that may arise, will be announced via the corresponding NOTAM.

All the working areas will be duly marked and lit, caution is recommended due to the presence of workers and machinery in operational hours.

No works will be performed when low visibility procedures are active.

FASE 1

Zona Norte - Superior.

Se realizarán trabajos de reconstrucción completa del pavimento, repavimentación de losas aisladas, reparación de desperfectos en losas y reposición de señalización horizontal.

Los trabajos se desarrollarán tanto en horario operativo como no operativo del aeropuerto.

Afectaciones operativas:

- TWY J cerrada hasta PRKG 5.
- PRKG 1, 2, 3, 4 y 5 fuera de servicio.
- PRKG 5A operativo.

PHASE 1


Upper - North Zone.

Complete reconstruction of the pavement, resurfacing of isolated slabs, repairing damage to slabs and replacement of markings will be carried out.

The works will be carried out in both operational and non-operational hours of the airport.

Operational Impacts:

- TWY J closed up to PRKG 5.
- PRKG 1, 2, 3, 4 and 5 out of service.
- PRKG 5A available.

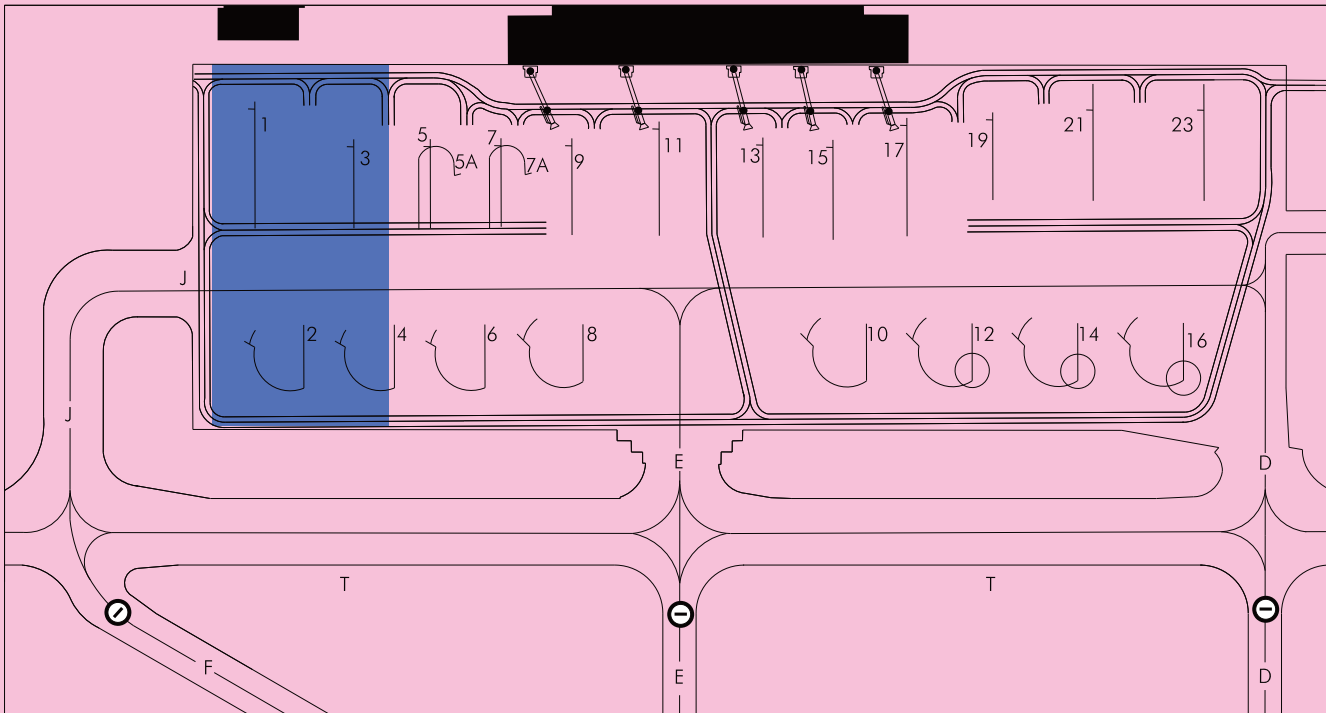

■ ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA

FASE 2

Zona Norte - Inferior.

Se realizarán trabajos de reconstrucción completa del pavimento, repavimentación de losas aisladas, reparación de desperfectos en losas y reposición de señalización horizontal.

Los trabajos se desarrollarán tanto en horario operativo como no operativo del aeropuerto.

Afectaciones Operativas:

- Cierre de TWY E y TWY J desde PRKG 4 hasta PRKG 13.
- PRKG 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11 y 13 fuera de servicio.

PHASE 2


Lower - North Zone.

Complete reconstruction of the pavement, resurfacing of isolated slabs, repairing damage to slabs and replacement of markings will be carried out.

The works will be carried out in both operational and non-operational hours of the airport.

Operational Impacts:

- Closing of TWY E and TWY J from PRKG 4 to PRKG 13.
- PRKG 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11 and 13 out of service.

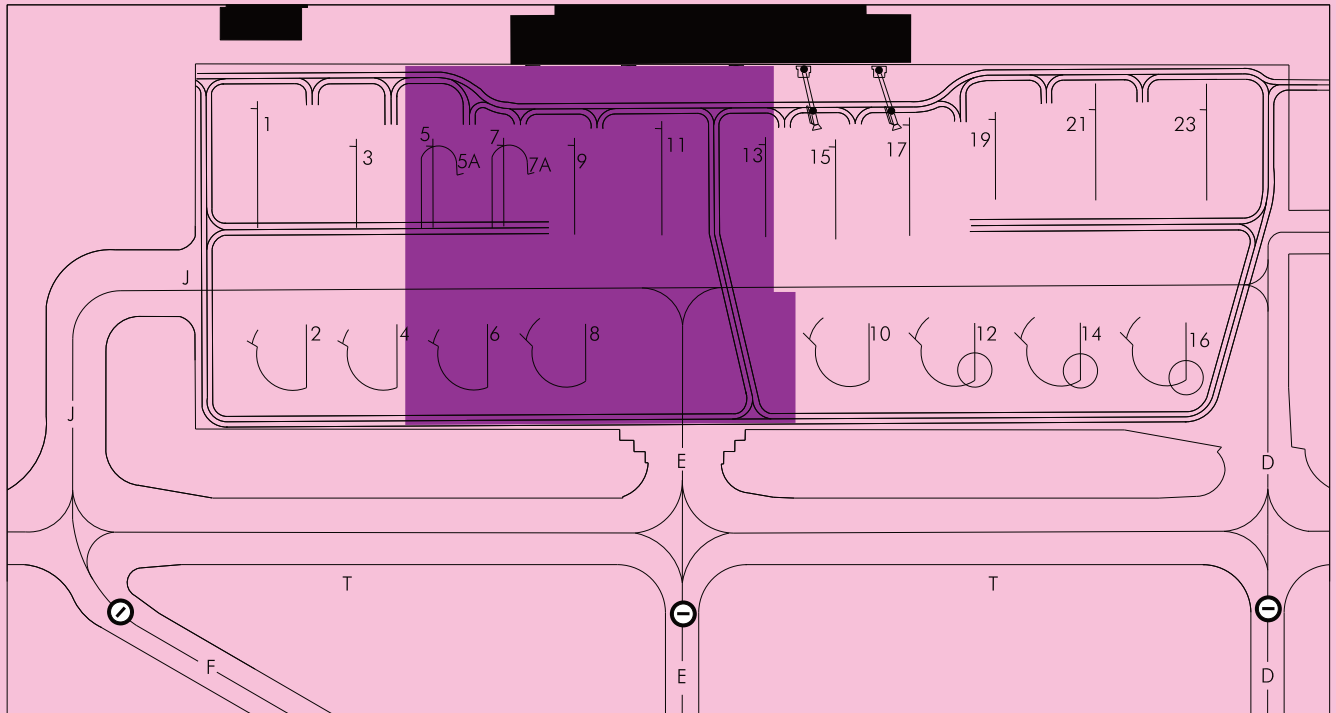

■ ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA

FASE 3

Zona Sur - Superior.

Se realizarán trabajos de reparación y reconstrucción de losas aisladas, junto con la ejecución de nuevas losas y reposición de señalización horizontal.

Los trabajos se desarrollarán tanto en horario operativo como no operativo del aeropuerto.

Afectaciones Operativas:

- TWY J cerrada desde PRKG 10 hasta PRKG 19.
- PRKG 10, 12, 13, 15, 17 y 19 fuera de servicio.
- PRKG 11 sólo operativo con rumbo hacia Sur, saliendo de plataforma por TWY E.

PHASE 3


Upper - South Zone.

Repair and reconstruction work will be carried out on isolated slabs, together with the construction of new slabs and the replacement of markings.

The works will be carried out in both operational and non-operational hours of the airport.

Operational Impacts:

- TWY J closed from PRKG 10 to PRKG 19.
- PRKG 10, 12, 13, 15, 17 and 19 out of service.
- PRKG 11 only operational with heading South, exiting the apron via TWY E.

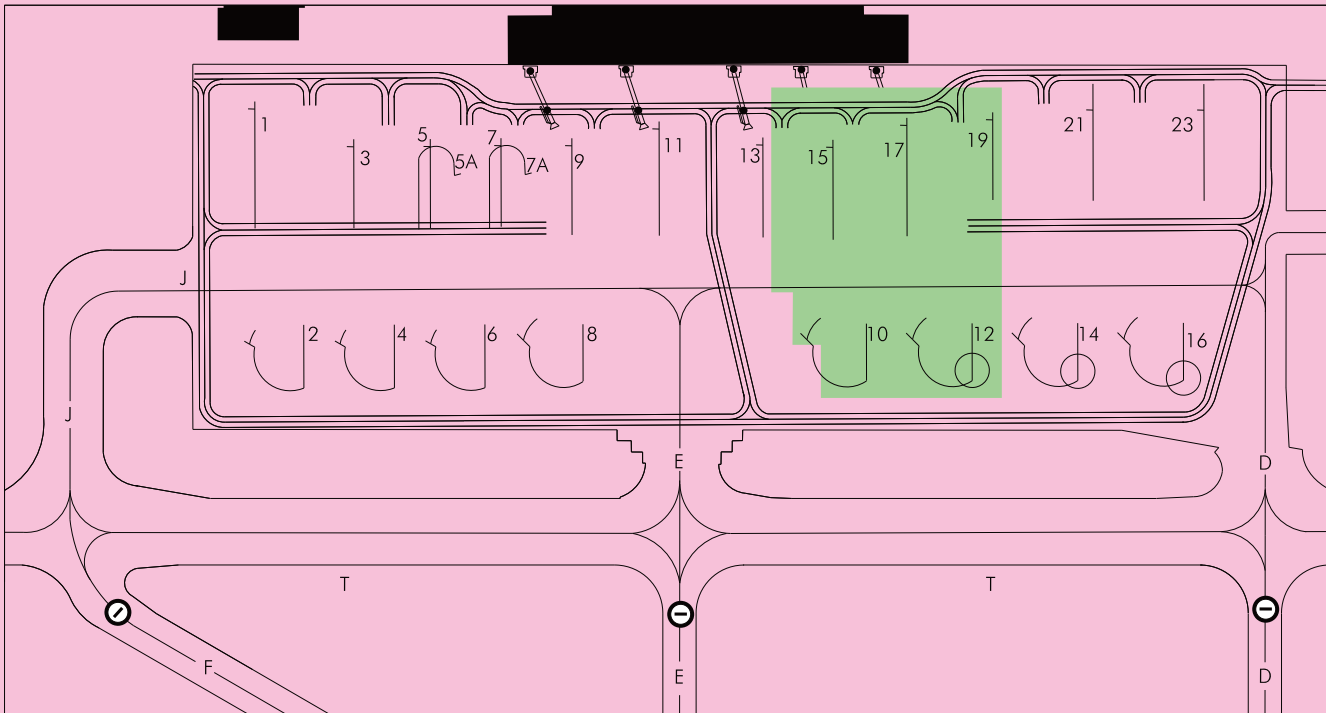

■ ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA

FASE 4

Zona Sur - Inferior.

Se realizarán trabajos de reparación y reconstrucción de losas aisladas, junto con la ejecución de nuevas losas y reposición de señalización horizontal.

Los trabajos se desarrollarán tanto en horario operativo como no operativo del aeropuerto.

Afectaciones Operativas:

- TWY J cerrada desde PRKG 12 hasta PRKG 23.
- PRKG 12, 14, 16, 17, 19, 21 y 23 fuera de servicio.
- Operaciones de helicópteros deberán solicitar guiado de vehículo SÍGAME hacia los PRKG 8 y/o PRKG 10 al estar los puestos de estacionamiento destinados para helicópteros fuera de servicio.
- No se aceptarán operaciones de aeronaves con letra clave E-IV.

PHASE 4


Lower - South Zone.

Repair and reconstruction work will be carried out on isolated slabs, together with the construction of new slabs and the replacement of markings.

The works will be carried out in both operational and non-operational hours of the airport.

Operational Impacts:

- TWY J closed from PRKG 10 to PRKG 19.
- PRKG 12, 14, 16, 17, 19, 21 and 23 out of service.
- Helicopter operations must request FOLLOW ME vehicle guidance to PRKG 8 and/or PRKG 10 as the helicopter stands are out of service.
- Code letter E-IV aircraft operations will not be accepted.

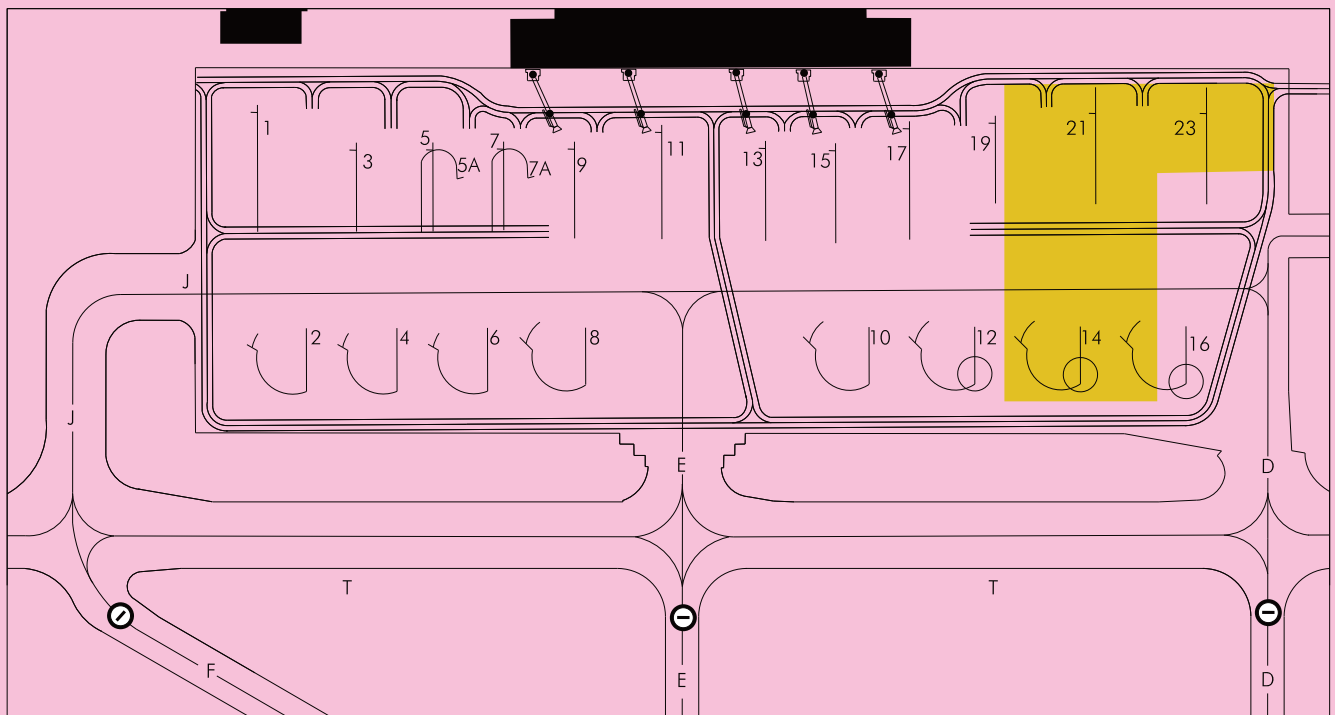

■ ZONA DE TRABAJO // WORKING AREA

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK
