

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA

Dirección AFTN: LEANZXTA

Teléfono: +34 913 213 363

E-mail: ais@enaire.es

Web: www.enaire.es

ENAIRe

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2

Kudos Innovation Campus Las Mercedes

28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 148/26

AIRAC 20-AUG-26

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 01-OCT-26

AD

CANCELAR: SUP 160/24

SUP 148/26

01OCT26/01OCT27EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

ZARAGOZA AD (LEZG).- Continuación de la obra adecuación de drenaje área de movimiento.


Hasta el 01 de octubre de 2027 estimado, se estarán realizando obras de mejora en las canalizaciones de drenaje del campo de vuelo.

Las fechas de inicio, fin y activación de las diversas fases de las obras, así como cualquier incidencia operativa se publicarán mediante el correspondiente NOTAM.

Todas las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas. Se recomienda precaución debido a la presencia de personal, maquinaria y movimiento de tierras.

Alcance de las obras: Adecuación del drenaje en la plataforma civil, con ejecución de nuevos colectores de saneamiento bajo plataforma.

Las obras se realizarán en las zonas reflejadas en el plano:

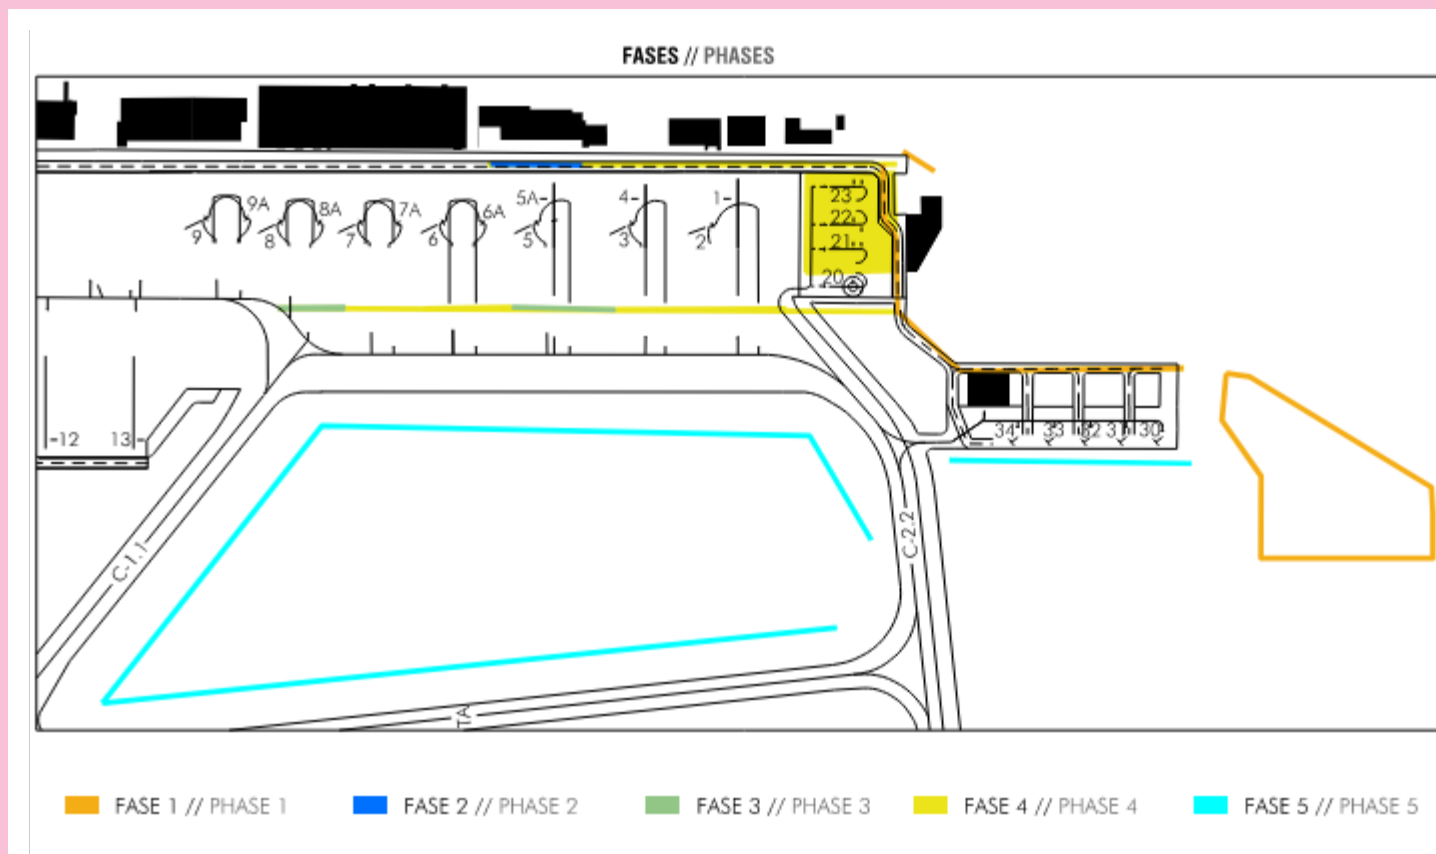

FASE 0: IMPLANTACIÓN DE CAMPAMENTO DE OBRA

Trabajos propios de implantación de campamento de obra.

Horario: La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas: Sin afección operativa.


FASE 1: ACTUACIONES ZONA ESTE DE LA PLATAFORMA

SUBFASE 1.1: EXCAVACIÓN BALSA 2 Y EJECUCIÓN COLECTOR D

Trabajos para la nueva canalización del colector D que transcurrirán al sur oeste de la plataforma Aviación General. Mientras que la excavación de la balsa 2, discurre a continuación de la plataforma de hangares junto al vallado.

Horario: La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas: Sin afección operativa.

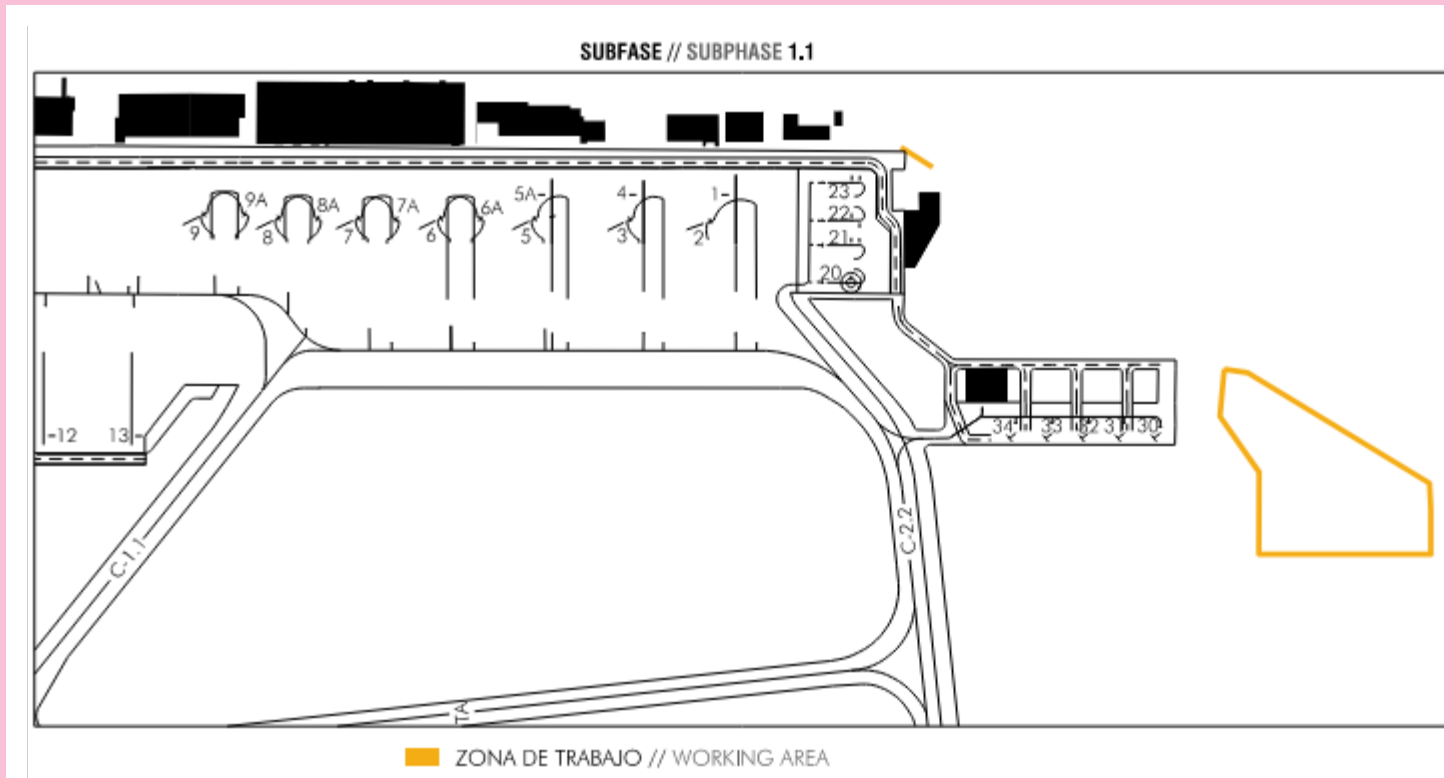


SUBFASE 1.2: MODIFICACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO E HIDRANTES, Y NUEVO ACERADO

Trabajos de modificación de la red de abastecimiento e hidrantes, así como la ejecución de nuevo acerado y la de la pintura en el tramo de senda peatonal afectado.

Horario: La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas: Afección al tráfico de vehículos por la vía de servicio junto a plataforma de Aviación General.

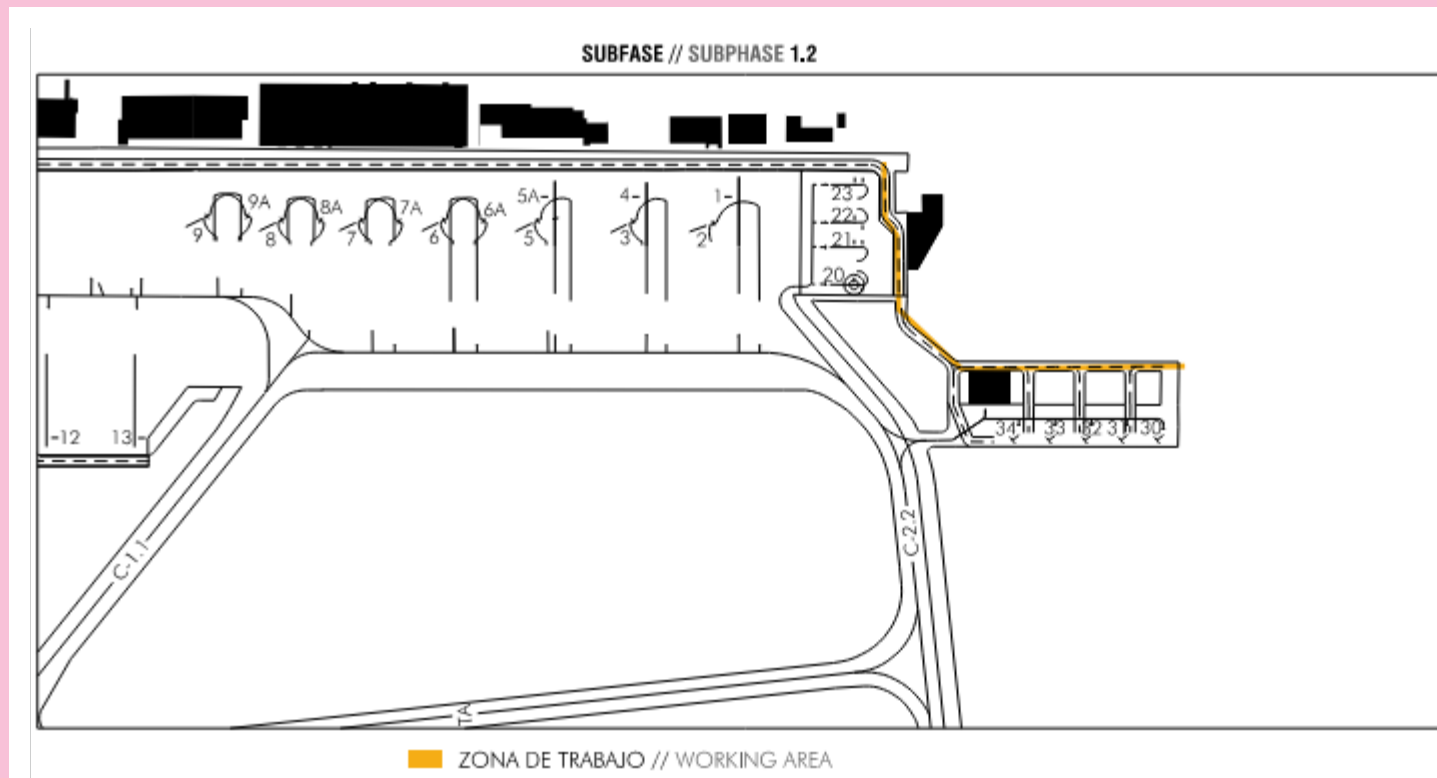


FASE 2: FINALIZACIÓN DEL COLECTOR C

Trabajos para la finalización del tramo de colector y canaleta frente al antiguo patio de carrillos junto a plataforma.

Horario: La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas: Desvío del vial de servicio.

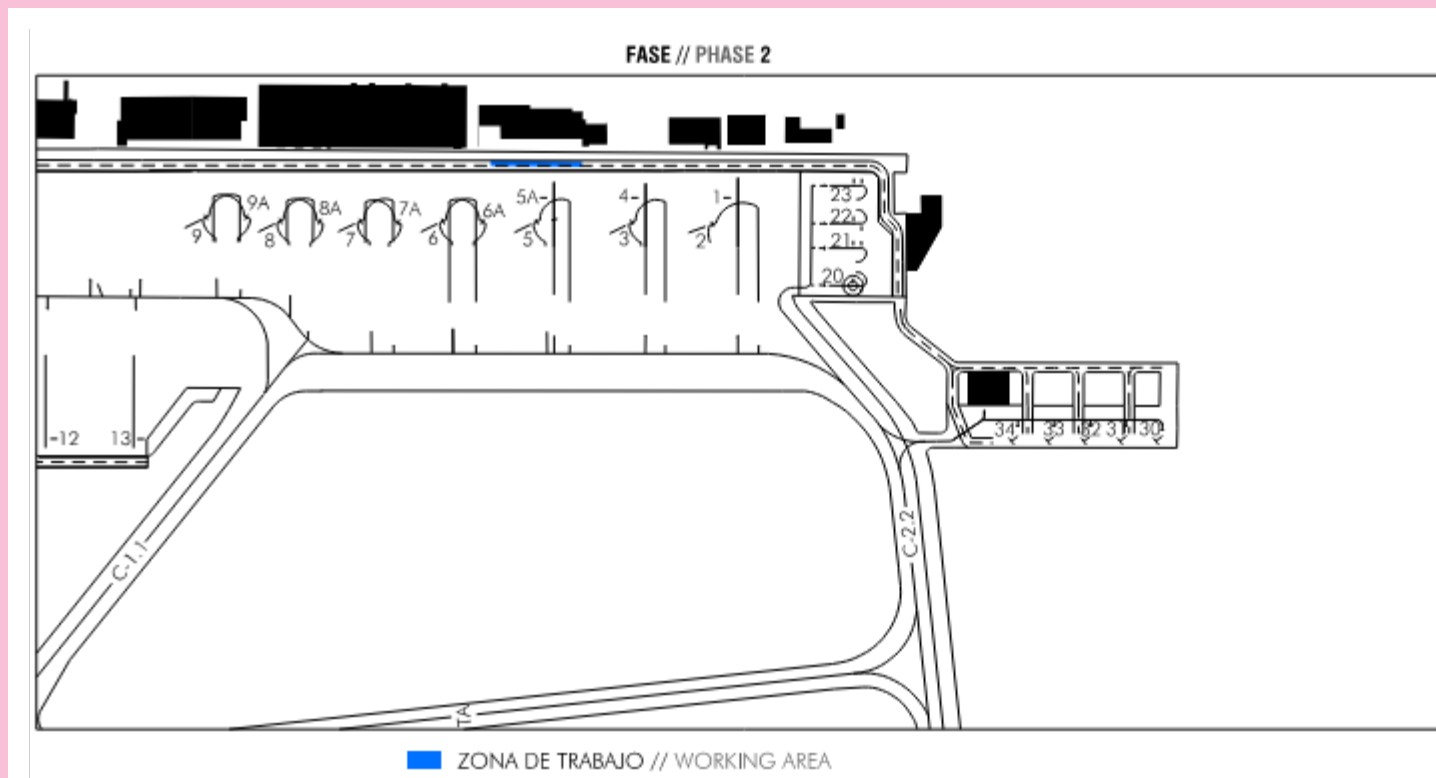

FASE 3: TRABAJOS SOBRE EL COLECTOR B


SUBFASE 3.1: MODIFICACIÓN DEL EJE DE LA CALLE DE RODAJE INTERIOR DE PLATAFORMA Y EJECUCIÓN DEL COLECTOR B, PRKG 8

Continuación de los trabajos de ejecución del colector B, en las inmediaciones del PRKG 8, y desvío temporal del eje de la calle de rodaje interior de plataforma entre los PRKG 5-7 al 8-9.

Horario: La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Desvío de la línea del eje de la calle de rodaje interior de la plataforma, entre los PRKG 5-7 hasta los PRKG 8-9.
- Cierre del PRKG 8.

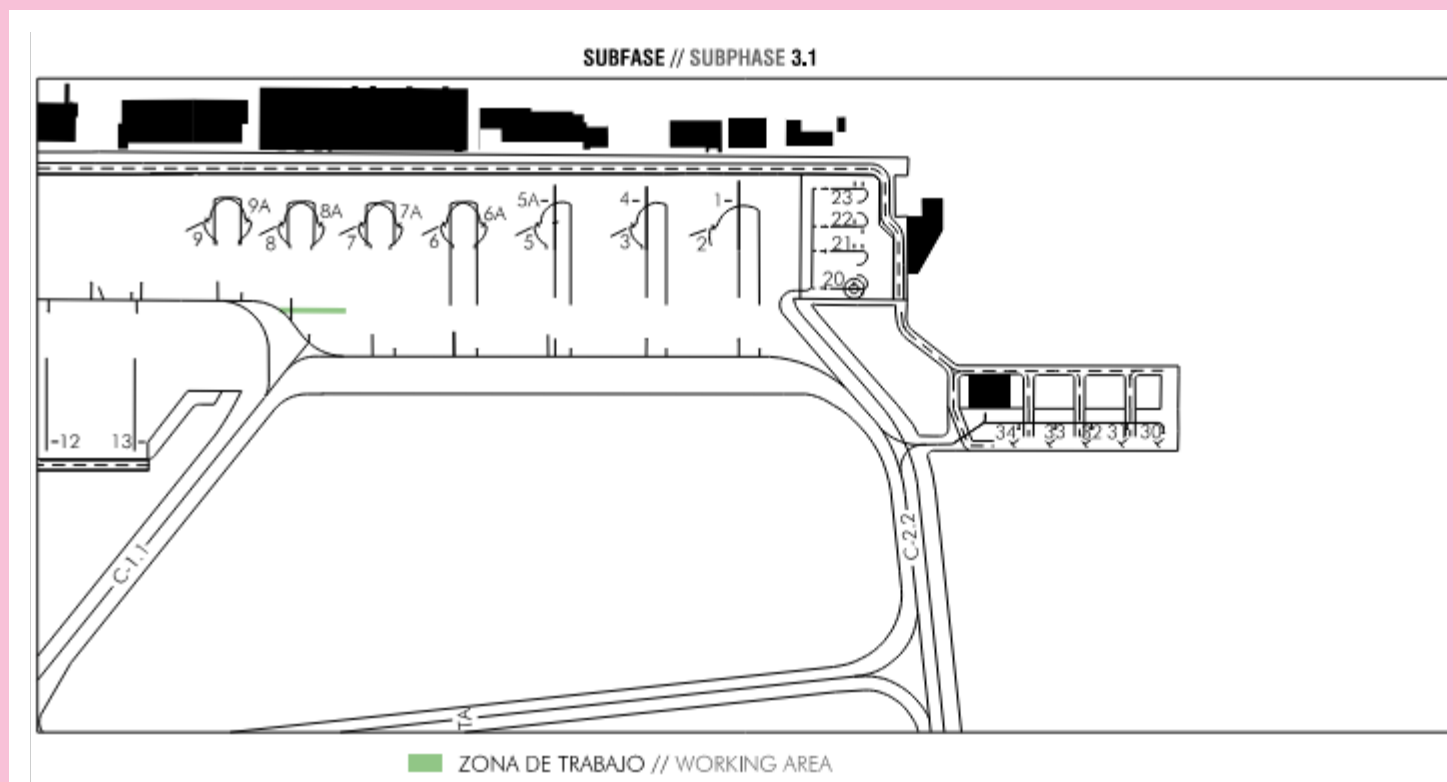


SUBFASE 3.2: FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL COLECTOR B, PRKG 9 Y RESTITUCIÓN DEL EJE DE LA CALLE DE RODAJE INTERIOR DE PLATAFORMA

Finalización de los trabajos de ejecución del colector B, en las inmediaciones del stand 9, y restitución del eje de la calle de rodaje interior de plataforma, a su posición original.

Horario: La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Restitución a la posición original de la línea del eje de la calle de rodaje interior de la plataforma.
- Cierre del PRKG 9.

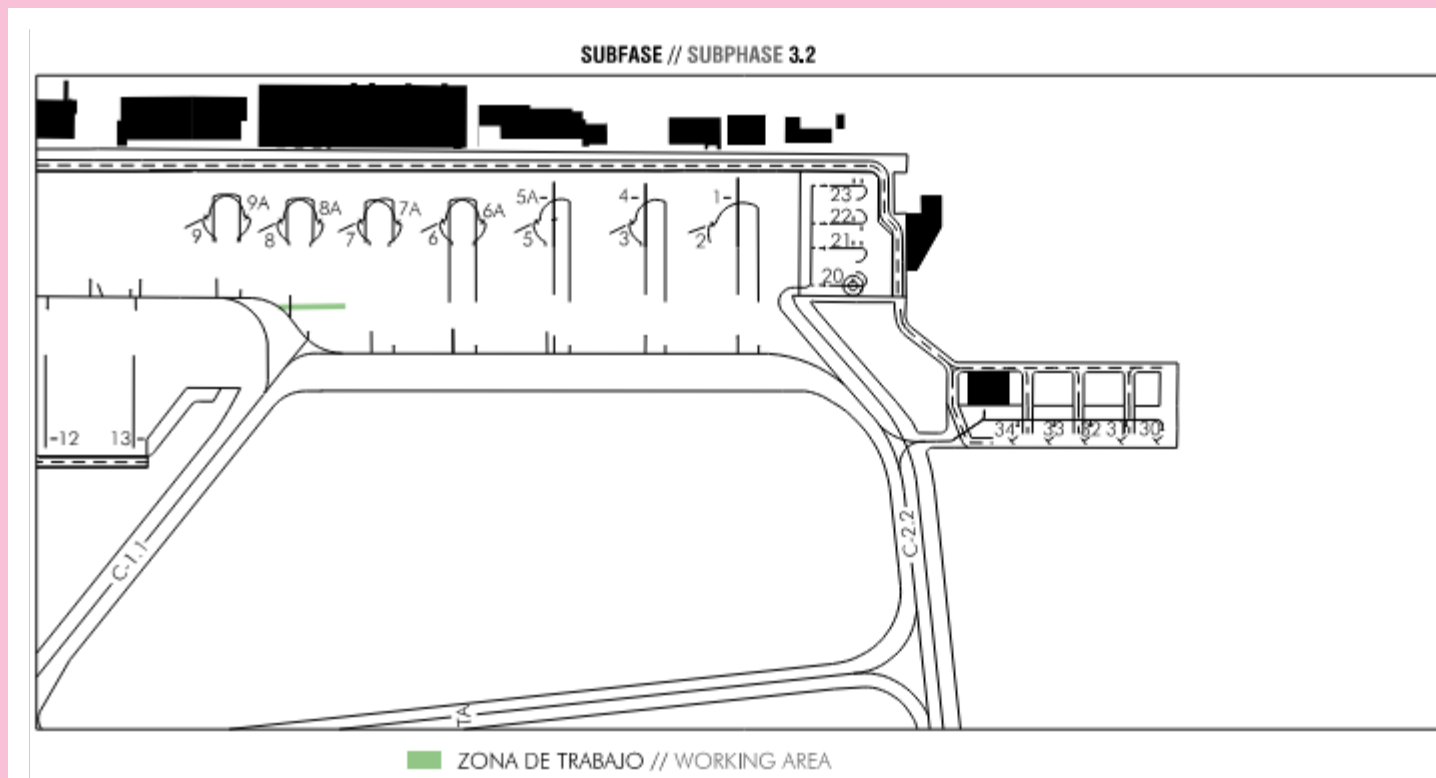


SUBFASE 3.3: TRABAJOS DE REPARACIÓN COLECTOR B, PRKG 5

Trabajos de reparación del colector B en las inmediaciones del PRKG 5.

Horario: La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas: Cierre del PRKG 5.

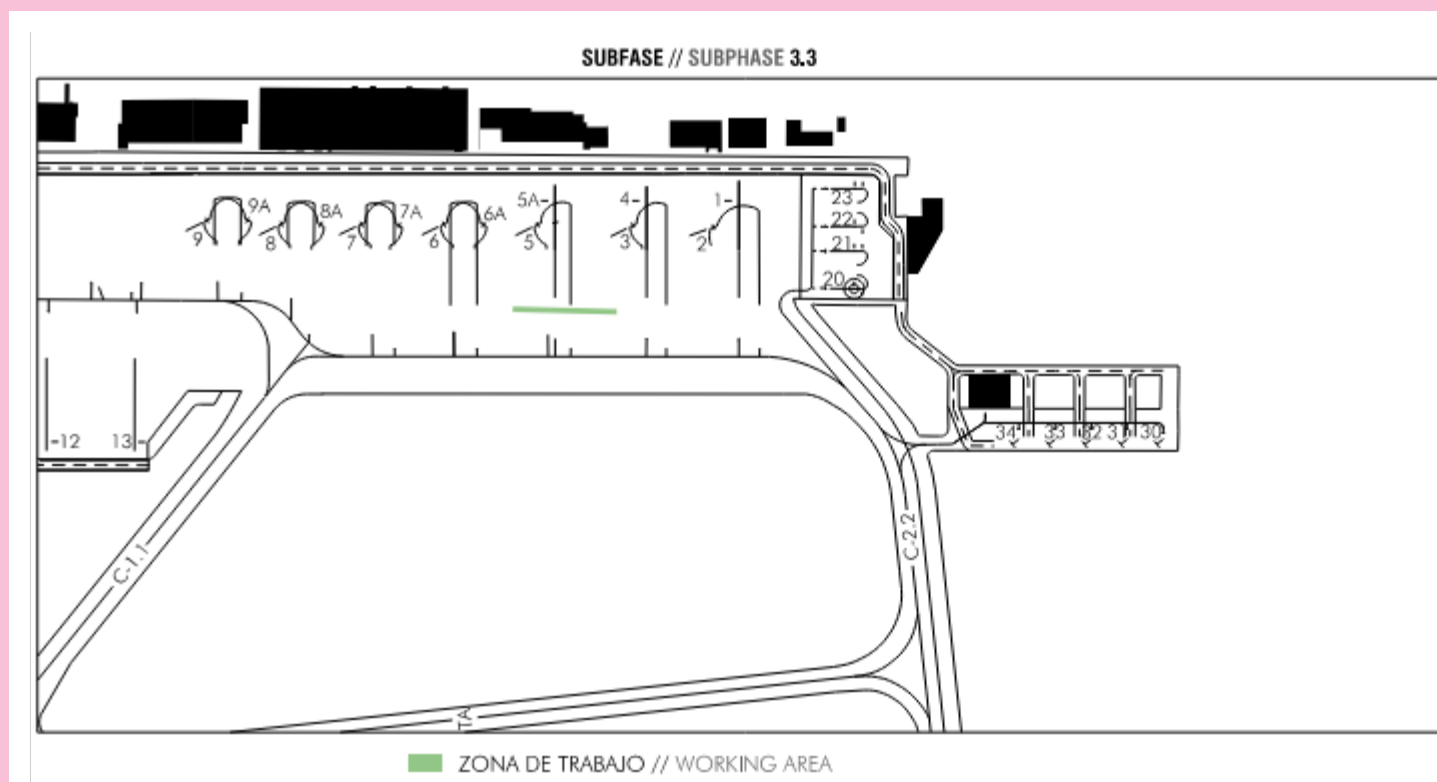

FASE 4: REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO


SUBFASE 4.1: REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS PROVISIONALES DEL COLECTOR C Y COLECTOR B. DESVÍO DE LA RED DE HIDRANTES.

Trabajos de reposición de pavimentos del colector C y del colector B. Dentro de esta subfase también se ejecutarán los trabajos de desvío de la red de hidrantes.

Horario: La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Para la reposición de los pavimentos del colector C y para los trabajos de desvío de la red de hidrantes se deberá hacer un desvío del vial de servicio.
- Durante los trabajos de reposición de los pavimentos del colector B se deberá cerrar el PRKG 23.

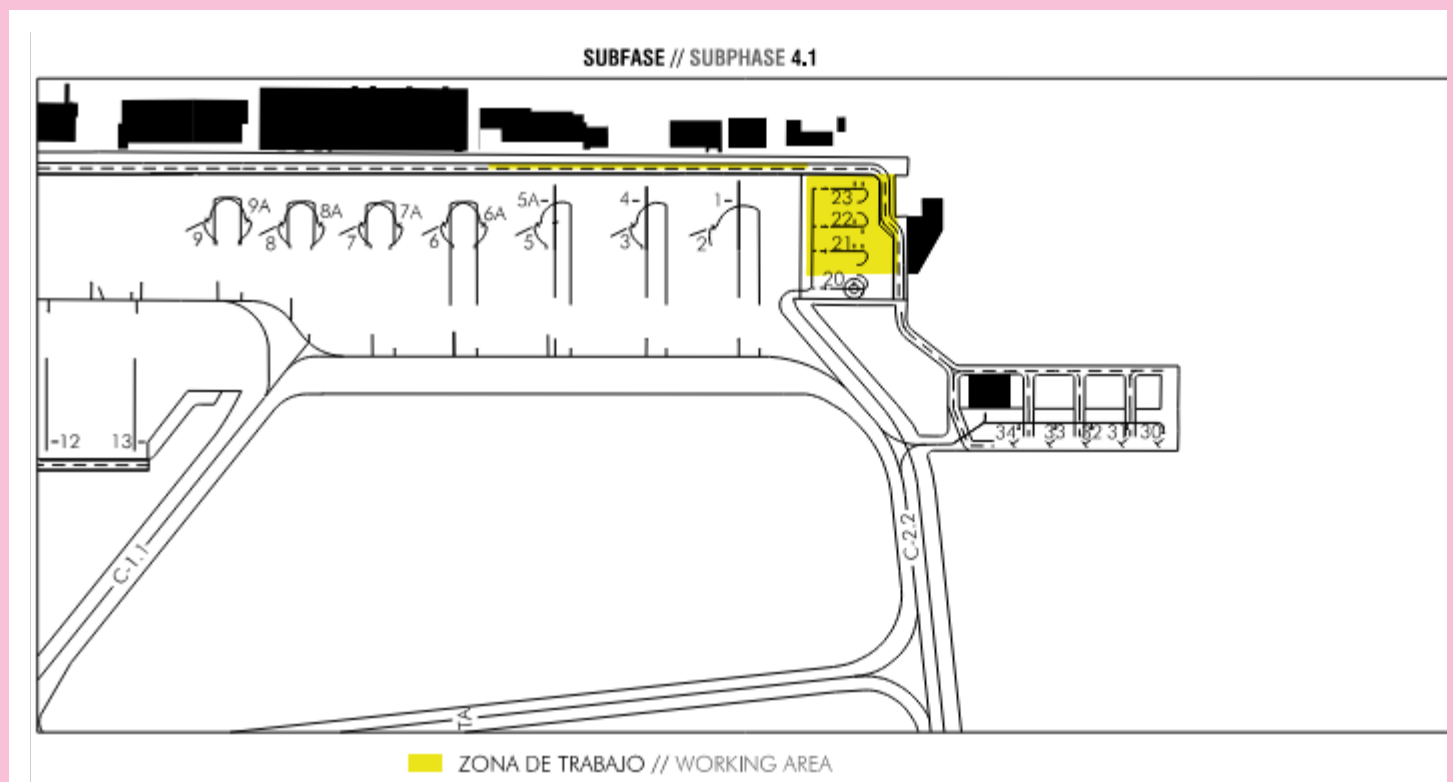


SUBFASE 4.2: REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS PROVISIONALES DEL COLECTOR SY COLECTOR B. DESVÍO DE LA RED DE HIDRANTES.

Trabajos de reposición de pavimentos del colector B y trabajos de reposición de pavimentos en el colector S.

Horario: La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Para la reposición de los pavimentos del colector B deberán cerrarse los PRKG 1, H1, 2, 3, 4, 6, 6A, 7 y 7A.
- La reposición de pavimentos en el colector S tendrá afección al tráfico de vehículos de la vía de servicio en la zona de plataforma de hangares.

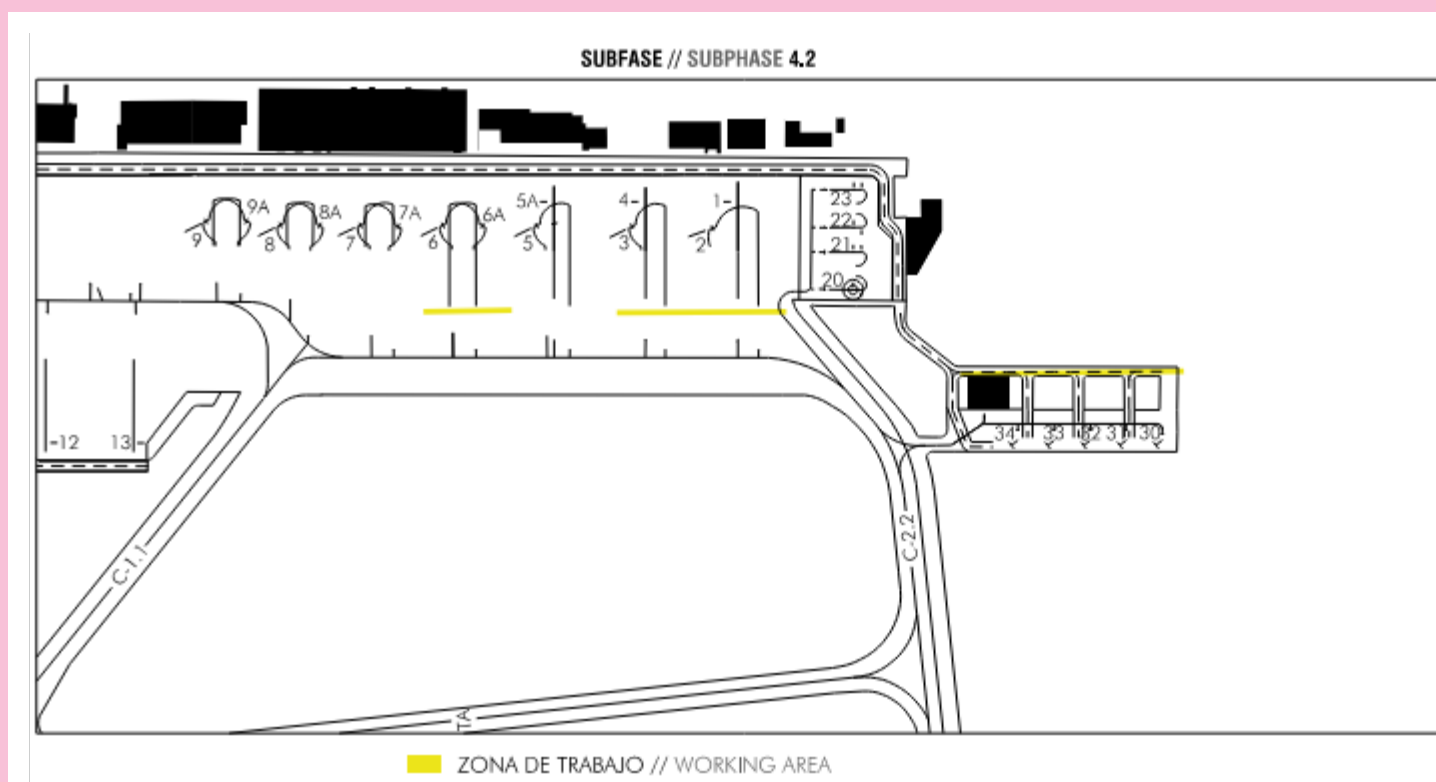


SUBFASE 4.3: EJECUCIONES DE JUNTAS DE CANALETAS DE LOS COLECTORES B Y C. REPARACIONES DE BORDES DE LOSAS DE PLATAFORMA A LO LARGO DEL COLECTOR B

Trabajos para la ejecución de junta longitudinal en las canaletas de los colectores B Y C. Igualmente se llevará a cabo una reparación de los bordes de las losas de plataforma a lo largo del colector B.

Horario: La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Para los trabajos de ejecución de la junta longitudinal y reparación de borde de losas a lo largo del colector B, se realizarán los trabajos a vista de tráfico.
- En el caso de la ejecución de la junta longitudinal de la canaleta, se desviará el vial de servicio.

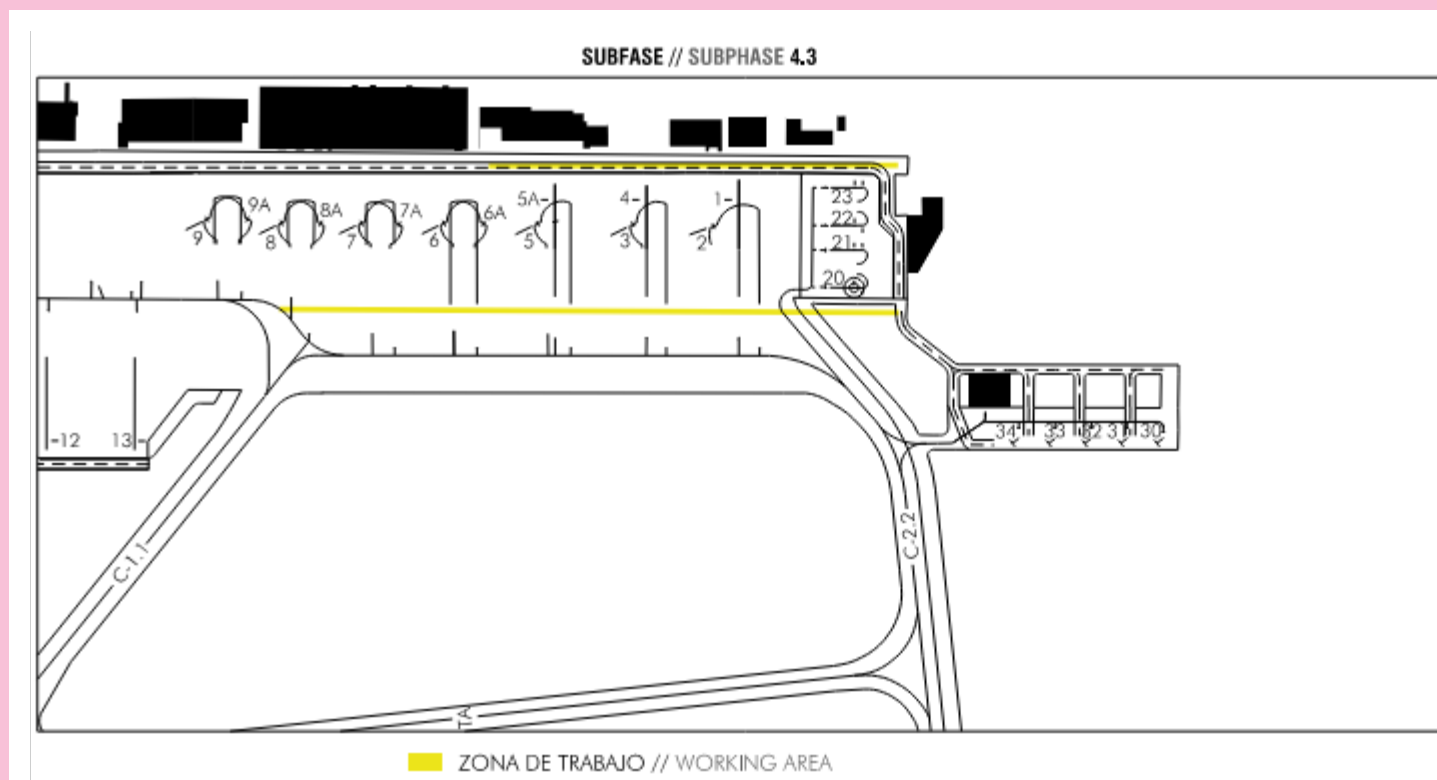

FASE 5: FINALIZACIÓN DE COLECTORES E Y S


Los trabajos sobre el colector E, comprenden el entubado de la cuneta en plataforma de Aviación General, incluyendo la ejecución de una arqueta y la cuneta perimetral en la isleta.

Los trabajos sobre el colector S consistirán en la reposición de la conexión junto a las instalaciones del agente de puesta a bordo de combustible, SLCA.

Horario: La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Los trabajos propuestos en el colector E podrán desarrollarse a vista de tráfico.
- Los trabajos de reposición del colector S tendrán afección al tráfico de vehículos en la vía de servicio de la zona de plataforma de hangares.

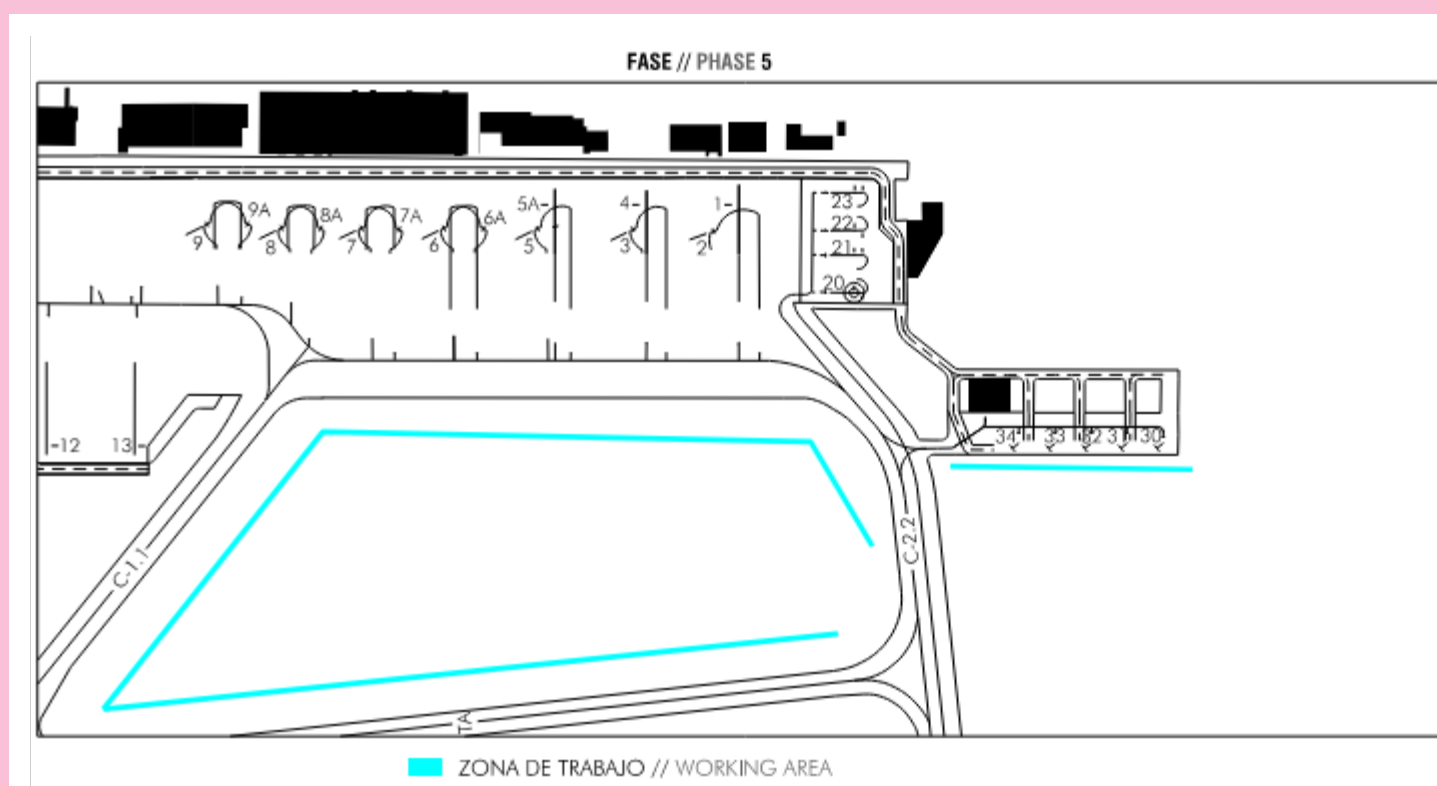

FASE 6: RETIRADA DE CAMPAMENTO DE OBRA

Trabajos para la retirada del campamento de obra, adecuación y limpieza de la zona.

Horario: La fase se llevará a cabo en horario operativo del aeropuerto.

Restricciones operativas: Sin afección operativa.

- SUP 148/26 -
