

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRES
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 43/22
AIRAC 10-MAR-22

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 21-APR-22 // EFFECTIVE DATE WEF 21-APR-22

AD

SUP 43/22

01JUN22/01JUN23EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

BURGOS/Villafraía AD (LEBG).- Obras de mejora en pista y calles de rodaje y nivelación de RESA RWY 22.

Desde el 01 de junio de 2022 hasta el 01 de junio de 2023 estimado, se llevarán a cabo obras de mejora en la pista y calles de rodaje, así como trabajos para la nivelación y adecuación de la RESA RWY 22.

La fecha de inicio y fin de cada fase, así como cualquier incidencia operativa que se produzca, se publicarán mediante NOTAM.

Todas las zonas de obra estarán debidamente señalizadas y balizadas en caso necesario. Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

Los trabajos se realizarán tanto en horario operativo como no operativo (ver horario operacional del AD en página AIP AD 2-LEBG 1).

Los trabajos se llevarán a cabo en tres (3) fases:

- Fase 0: implantación y trabajos previos;
- Fase 1: tratamiento superficial de RWY y TWY. Dividida en cuatro subfases;
- Fase 2: adecuación y nivelación de RESA 22.

Las áreas afectadas y la afectación operativa en cada una de ellas son las que se reflejan a continuación.

FASE 0 – Implantación y trabajos previos.

Actuaciones: establecimiento de zonas de acopio, maquinaria y campamento de obra.

Zona de actuación: campamento de obra.

Duración estimada: 45 días.

Horario: horario diurno.

Restricciones operativas:

- Sin restricciones operativas.

SUP 43/22

01JUN22/01JUN23EST

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

BURGOS/Villafraía AD (LEBG).- Refurbishing works on runway and taxiways and levelling of RESA RWY 22.

From 01 June 2022 until 01 June 2023 (estimated), refurbishing works on the runway and taxiways as well as works for the levelling and refurbishing of RESA RWY 22, will take place.

The start and end dates of each phase, as well as any operational incident that may occur, will be published by NOTAM.

All working areas shall be duly marked and lit if required. Caution is recommended due to the presence of personnel and machinery.

Works will take place during both operational and non-operational hours (see AD operational hours on AIP page AD 2-LEBG 1).

These works will take place in three (3) phases:

- Phase 0: implementation and previous works;
- Phase 1: RWY and TWYs surface treatment. Divided into four subphases;
- Phase 2: refurbishing and levelling of RESA 22.

The areas affected and the operational impact in each one are depicted below.

PHASE 0 – Implementation and previous works.

Actions: establishment of stockpiling, machinery and camp site areas.

Action area: camp site.

Estimated duration: 45 days.

Hours: daytime hours.


Operational restrictions:

- No operational restrictions.

FASE 1 – Tratamiento superficial de RWY y TWY.

PHASE 1 – RWY and TWY surface treatment.

FASE 1 // PHASE 1

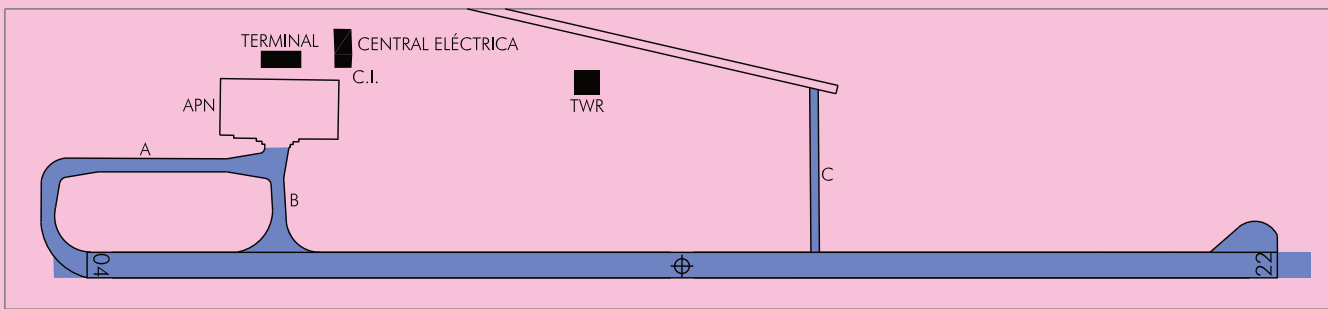

ZONA DE OBRAS // WORKING AREA

Subfase 1.1 Actuaciones en RWY 04/22

Actuaciones: obras para tratamiento superficial por tramos a lo largo de la pista.

Zona de actuación:

- RWY 04/22.
- Plataforma de viraje cabecera de RWY 22.
- Área pavimentada al norte de cabecera RWY 22.

Duración estimada: 63 días.

Horario: horario no operativo.

Restricciones operativas:

- Pista fuera de servicio en horario no operativo.
- Pintura incompleta en tramos de pista.
- Balizamiento de borde de pista.

Subphase 1.1 Actions on RWY 04/22

Actions: surface treatment works by segments along the runway.

Action area:

- RWY 04/22.
- Turn pad head of RWY 22.
- Paved area to the North of head RWY 22.


Estimated duration: 63 days.

Hours: non-operational hours.

Operational restrictions:

- Runway out of service during non-operational hours.
- Incomplete paint job on runway segments.
- Runway edge lighting.

SUBFASE 1.1 // SUBPHASE 1.1



ZONA DE OBRAS // WORKING AREA

Subfase 1.2 Tratamiento superficial TWY A

Actuaciones: obras para tratamiento superficial de TWY.

Zona de actuación:

- TWY A.

Duración estimada: 5 días.

Horario: horario no operativo.

Restricciones operativas:

- TWY A fuera de servicio.
- Entrada/salida de pista por TWY B.
- Retroceso en cabecera RWY 04 para acceso o abandono de la pista.

Subphase 1.2 TWY A surface treatment

Actions: TWY surface treatment works.

Action area:

- TWY A.


Estimated duration: 5 days.

Hours: non-operational hours.

Operational restrictions:

- TWY A out of service.
- Runway entry/exit by TWY B.
- Backtrack on head of RWY 04 to access or exit the runway.

SUBFASE 1.2 // SUBPHASE 1.2

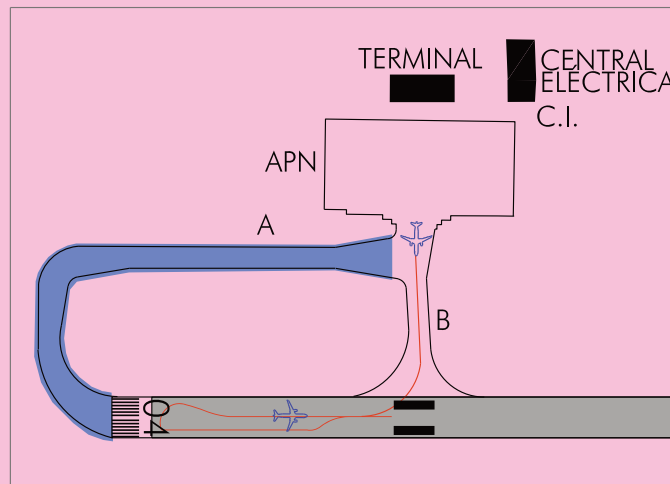

ZONA DE OBRAS // WORKING AREA



SEÑALIZACIÓN SOBREVIRAJE EN CABECERA RWY 04
OVERSTEERING MARKING ON HEAD OF RWY 04

Subfase 1.3 Tratamiento superficial TWY B

Actuaciones: obras para tratamiento superficial de TWY.

Zona de actuación:

- TWY B.

Duración estimada: 5 días.

Horario: horario no operativo.

Restricciones operativas:

- TWY B fuera de servicio.
- Entrada/salida de pista por TWY A.
- Pintura incompleta en entronques TWY A y TWY B con plataforma durante un día.

Subphase 1.3 TWY B surface treatment

Actions: TWY surface treatment works.

Action area:

- TWY B.


Estimated duration: 5 days.

Hours: non-operational hours.

Operational restrictions:

- TWY B out of service.
- Runway entry/exit by TWY A.
- Incomplete paint job on TWY A and TWY B links with the apron during one day.

SUBFASE 1.3 // SUBPHASE 1.3

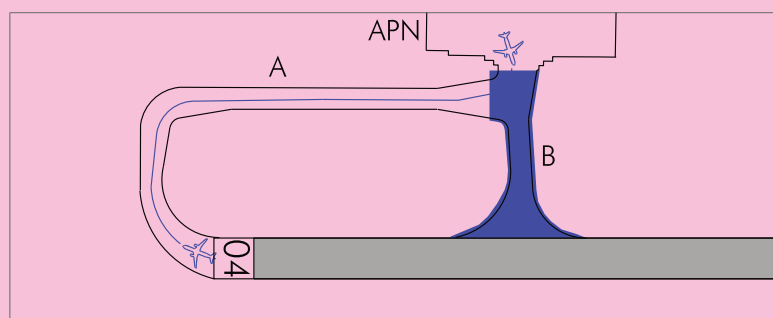

Subfase 1.4 Tratamiento superficial TWY C

Actuaciones: obras para tratamiento superficial de TWY.

Zona de actuación:

- TWY C.

Duración estimada: 9 días.

Horario: horario no operativo.

Restricciones operativas:

- TWY C fuera de servicio.
- Pintura incompleta en TWY C durante un día.

Subphase 1.4 TWY C surface treatment

Actions: TWY surface treatment works.

Action area:

- TWY C.


Estimated duration: 9 days.

Hours: non-operational hours.

Operational restrictions:

- TWY C out of service.
- Incomplete paint job on TWY C during one day.

SUBFASE 1.4 // SUBPHASE 1.4



**ZONA DE OBRAS
WORKING AREA**

FASE 2 – Nivelación de RESA 22.

Actuaciones: obras para la nivelación de la RESA 22.

Zona de actuación: RESA 22.

Duración estimada: 30 días.

Horario: horario nocturno.

Restricciones operativas:

- Pista fuera de servicio durante horario no operativo (1800-0600).

FASE 2 – Levelling of RESA 22.

Actions: works for levelling of RESA 22.

Action area: RESA 22.


Estimated duration: 30 days.

Hours: night-time hours.

Operational restrictions:

- Runway out of service during non-operational hours (1800-0600).

FASE 2 // PHASE 2

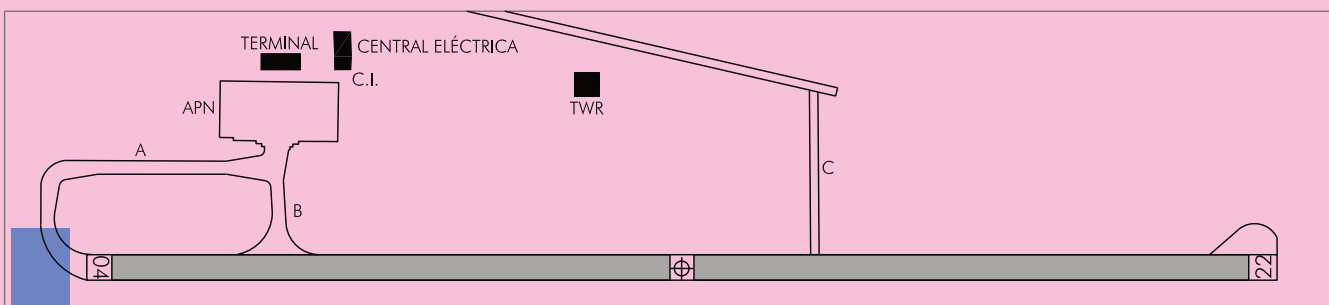

ZONA DE OBRAS // WORKING AREA
