

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 154/20
AIRAC 17-DEC-20

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 28-JAN-21 // EFFECTIVE DATE WEF 28-JAN-21

AD

SUP 154/20 28JAN21/28JAN22EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

GRANADA/Federico García Lorca Granada-Jaén AD.- Obras para la ampliación del drenaje en el campo de vuelos.

Hasta el 28 de enero de 2022 estimado, se realizarán los trabajos de mejora del drenaje en el aeropuerto, implementando una red de colectores en la zona norte.

La obra se llevará a cabo en 6 fases subdivididas en varias subfases, siendo las áreas afectadas en cada una de ellas las que se reflejan en el presente documento. El orden de ejecución de las fases y subfases puede diferir de lo especificado en este suplemento, y podrán estar activadas varias fases simultáneamente.

La fecha de inicio y fin de cada fase y subfase, así como cualquier incidencia operativa que se produzca se anunciarán mediante el correspondiente NOTAM.

Todas las zonas de obra estarán debidamente señalizadas y balizadas.

Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

Las obras se realizarán tanto dentro como fuera del horario operativo del aeropuerto, en coordinación con Operaciones y TWR del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.

No se realizarán trabajos cuando estén activados los procedimientos de visibilidad reducida.

Fase 0: Actuaciones previas.

Instalación de campamento de obras en el lado tierra del aeropuerto, acopios, recopilación de información y documentación.

Sin afección operativa.

Fase 1: Trabajos cerca de THR 09.

Los trabajos de esta fase se realizarán fuera del horario operativo del aeropuerto.

Subfase 1.1: Trabajos en TWY E2.

Restricciones operativas:

- TWY E2 cerrada durante la ejecución de esta subfase.
- Acceso a THR 09 por TWY E1.
- No se autorizarán las operaciones de aeronaves de letra de clave E durante la ejecución de esta subfase.

Subfase 1.2 Trabajos en TWY E1.

Restricciones operativas:

- TWY E1 cerrada durante la ejecución de esta subfase.
- Acceso a THR 09 por TWY E2.

SUP 154/20 28JAN21/28JAN22EST

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

GRANADA/Federico García Lorca Granada-Jaén AD.- Works to expand drainage on the airfield.

Until 28 January 2022 (estimated), drainage improvement works will be carried out at the airport, with the implementation of a collector network in the North part.

The works will take place in 6 phases, divided into several subphases, and the areas affected in each are those specified in the present document. The phases and subphases might not necessarily be executed in the order stated in this supplement, and several phases might be activated simultaneously.

The start and end dates of each phase, as well as any operational incident arising, will be announced by the corresponding NOTAM.

All the working zones will be properly marked and lit.

Caution is recommended due to the presence of personnel and machinery.

The works will take place both during and outside operational hours, in coordination with Operations and TWR at Federico García Lorca Granada-Jaén Airport.

When the low visibility procedures are in effect, no works will take place.

Phase 0: Prior actions.

Installation of work camp on the ground side of the airport, collections, compilation of information and documentation.

No operational impact.

Phase 1: Works close to THR 09.

Works in this phase shall be accomplished outside the operational hours of the airport.

Subphase 1.1: Works on TWY E2.

Operational restrictions:

- TWY E2 closed throughout the execution of this subphase.
- Access to THR 09 via TWY E1.
- Operations by code letter E aircraft will not be cleared during the execution of this subphase.

Subphase 1.2: Works on TWY E1.


Operational restrictions:

- TWY E1 closed throughout the execution of this subphase.
- Access to THR 09 via TWY E2.

Subfase 1.3 Trabajos en RESA y margen.
Sin restricciones operativas.

Subphase 1.3: Works in RESA and margin.
No operational restrictions.

ÁREAS DE TRABAJO FASE 1 // PHASE 1 WORKING AREAS

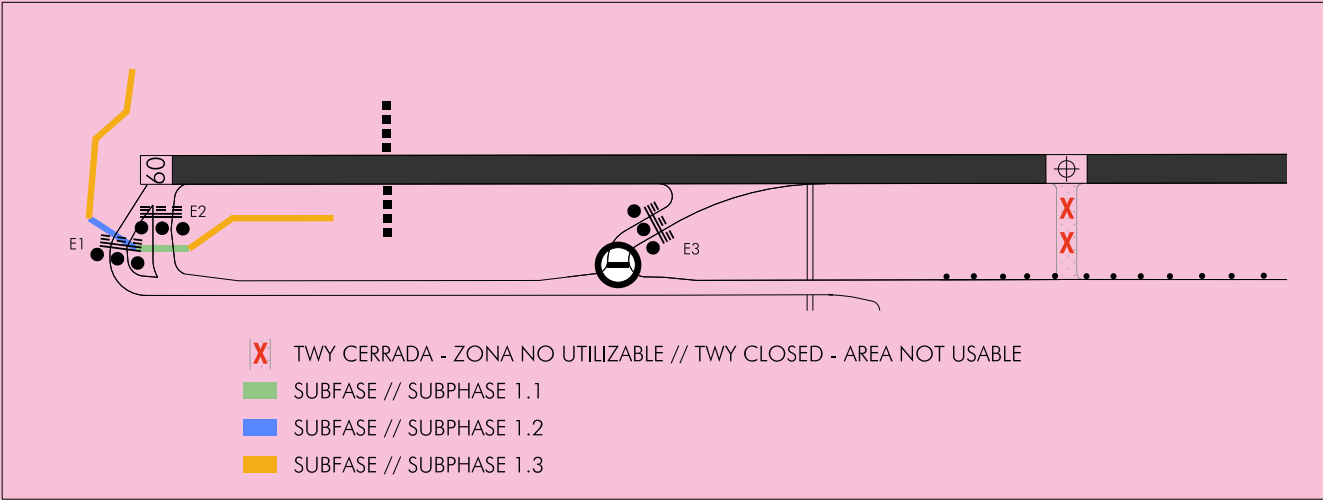

Fase 2: Actuaciones en zona norte del campo de vuelo.

Phase 2: Actions in the North zone of the airfield.

Subfase 2.1: Trabajos en paralelo a la pista en toda su longitud.

Subphase 2.1: Works parallel to the entire length of the runway.

Durante esta subfase se realizarán trabajos fuera de franja de RWY 09/27, a lo largo todo el día, y sin afección a las operaciones.

During this subphase, works will be executed outside the RWY 09/27 strip, throughout the day, and without operational impact.


Subfase 2.2: Trabajos en zona Noroeste del campo de vuelo.

Subphase 2.2: Works in the Northwest zone of the airfield.

Durante esta subfase se realizarán trabajos dentro de la franja de pista, próximos a THR 09, fuera del horario operativo del aeropuerto y sin afección a las operaciones.

During this subphase, works will be carried out within the runway strip, close to THR 09, outside the operational hours of the airport and without operational impact.

ÁREAS DE TRABAJO FASE 2 // PHASE 2 WORKING AREAS

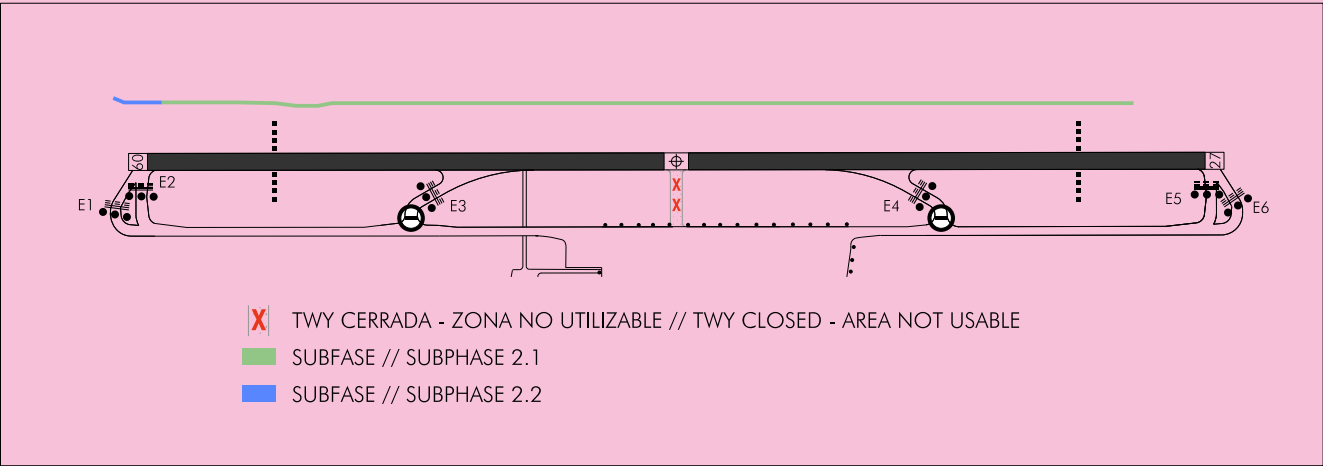

Fase 3: Trabajos cerca de THR 27.

Subfase 3.1: Trabajos en RESA y franja de pista.

Los trabajos de esta subfase se realizarán fuera del horario operativo del aeropuerto y sin afección a las operaciones.

Subfase 3.2: Trabajos en la franja de TWY E4 y E6.

Los trabajos de esta subfase se realizarán a lo largo de todo el día.

Durante esta fase las TWY E4 y E6 solo podrán ser utilizadas por aeronaves de letra de clave C o inferior.

Phase 3: Works close to THR 27.

Subphase 3.1: Works in RESA and runway strip.


The works of this subphase will be performed outside the operational hours of the airport and without operational impact.

Subphase 3.2: Works in the TWY E4 and E6 strips.

The works of this subphase will be carried out throughout the day.

During this phase, TWY E4 and E6 may only be used by code letter C or lower aircraft.

ÁREAS DE TRABAJO FASE 3 // PHASE 3 WORKING AREAS

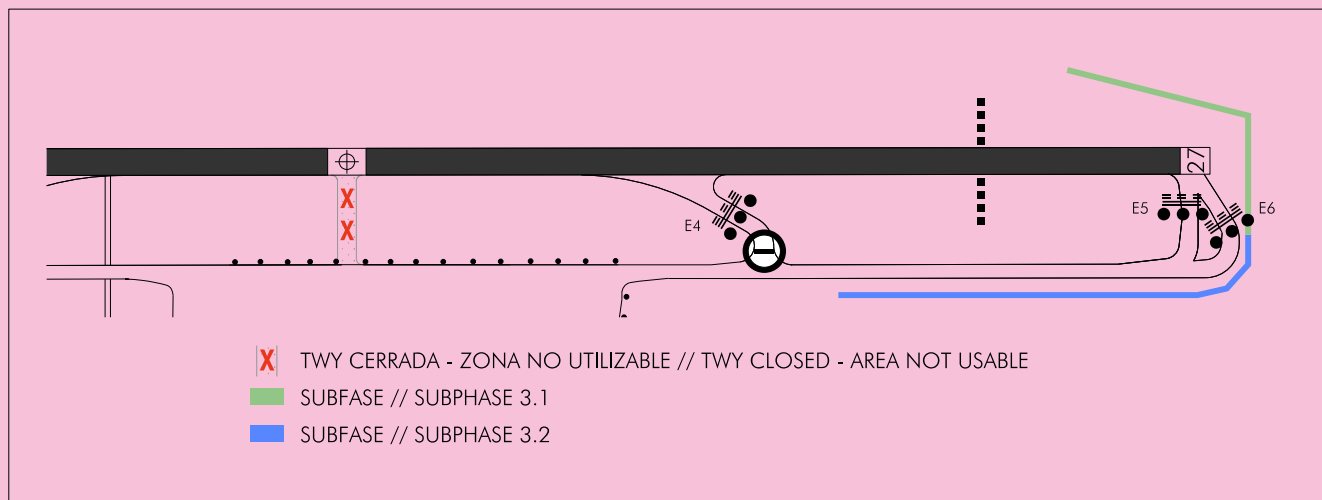

Fase 4: Obra Civil e instalaciones.

Durante esta fase se realizarán trabajos de obra civil fuera de franja de pista, a lo largo de todo el día y sin afección a las operaciones.

Phase 4: Civil engineering and facilities.

During this phase, civil engineering works will be executed outside the runway strip, throughout the day, and without operational impact.

Fase 5. Desactivación de la Obra.

Trabajos de pruebas de estanqueidad y puesta en marcha, desmontaje de campamento y retirada de instalaciones, a lo largo de todo el día, y sin restricciones operativas.

Phase 5. Project closure.

Waterproofness and commissioning tests, removal of work camp and withdrawal of facilities, throughout the day, and without operational impact.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK
