

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 116/21
AIRAC 01-JUL-21

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 12-AUG-21 // EFFECTIVE DATE WEF 12-AUG-21

AD

SUP 116/21 12AUG21/12AUG22EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

PALMA DE MALLORCA AD.- Actuaciones en el campo de vuelo.

Hasta el 12 de agosto 2022 estimado, se estarán realizando obras en el campo de vuelo del aeropuerto de Palma de Mallorca.

Las obras se llevarán a cabo en tres fases, divididas en varias subfases, siendo las áreas afectadas en cada una de ellas las que se reflejan en el presente documento.

La ejecución de las fases no necesariamente deberá realizarse en el orden expuesto.

Las fechas de inicio y fin de cada fase y subfase, así como cualquier incidencia operativa se publicarán mediante el correspondiente NOTAM.

Todas las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas.

Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

Las obras se realizarán en horario diurno y nocturno en coordinación con el aeropuerto.

No se realizarán trabajos cuando estén activados los procedimientos de visibilidad reducida.

Los trabajos consistirán en:

- Cambiar luces halógenas de las calles de rodaje a LED.
- Reubicación de luces en TWY S3.
- Adecuación de basamentos en el campo de vuelo.
- Adecuación nivelación de franja de la RWY 06R/24L.
- Construcción de un nuevo edificio SEI N en la zona norte del aeropuerto.
- Adecuación del edificio SEI S.

SUP 116/21 12AUG21/12AUG22EST

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

PALMA DE MALLORCA AD.- Works in the airfield.

Until 12 August 2022 (estimated), works will be under way in the airfield of Palma de Mallorca Airport.

The works will be conducted in three phases, divided into various subphases, with the areas affected in each one of them being those set out in this document.

The phases need not necessarily be executed in the order given.

The start and end dates of each phase and subphase, as well as any operational incident, will be published by the corresponding NOTAM.

All the working zones will be duly marked and lit.

Caution is recommended due to the presence of personnel and machinery.

The works will take place by day time and by night-time in coordination with the airport.

When the low visibility procedures are activated, no works will take place.

The works will consist of:

- Changing halogen lamps to LED lamps on taxiways.
- Relocation of lights on TWY S3.
- Compliance for plinths in the airfield.
- Strip levelling compliance for RWY 06R/24L.
- Construction of a new SEI N building in the north zone of the airport.
- Compliance for the SEI S building.

FASE 1. Trabajos en TWY NORTH.

Descripción de los trabajos.

Durante esta fase se ejecutarán los trabajos de cambio de balizas halógenas a LED en las diferentes calles de rodaje del aeropuerto y de adecuación de basamentos en la zona de la TWY H4.

SUBFASE 1.1. Trabajos en pista y TWY NORTH.

Horario: Los trabajos se realizarán en cualquier horario, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierres de la RWY 06L/24R y TWY NORTH.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afección puntual.

PHASE 1. Works on TWY NORTH.

Description of the works.

During this phase, the works to change halogen lamps to LED technology on the different taxiways of the airport, and plinth compliance in the area of TWY H4, will take place.

SUBPHASE 1.1. Works on runway and TWY NORTH.


Schedule: The works may take place at any time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- RWY 06L/24R and TWY NORTH closed.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 1.1

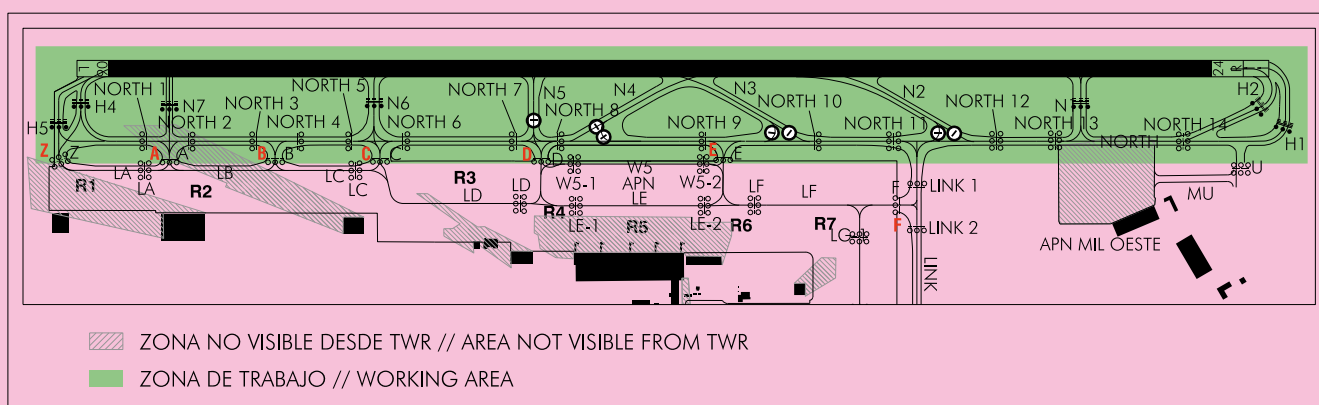

SUBFASE 1.2. Trabajos en puerta Z con afección a TWY NORTH.

Horario: Los trabajos se realizarán en cualquier horario, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de la puerta Z.
- Cierre de TWY H5.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afección puntual.

SUBPHASE 1.2. Works on gate Z with impact on TWY NORTH.


Schedule: The works may take place at any time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- Gate Z closed.
- TWY H5 closed.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 1.2

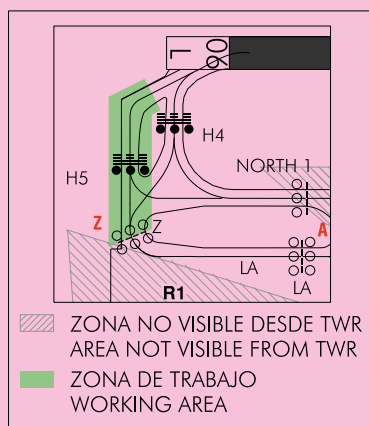

SUBFASE 1.3. Trabajos en puerta A con afección a TWY NORTH.

Horario: Los trabajos se podrán realizar en cualquier horario, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de la puerta A.
- Cierre de TWY H4.
- Cierre de salida TWY N7.
- Cierre de TWY NORTH entre TWY H4 y NORTH 3.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afección puntual.

SUBPHASE 1.3. Works on gate A with impact on TWY NORTH.


Schedule: The works may take place at any time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- Gate A closed.
- TWY H4 closed.
- TWY N7 exit closed.
- TWY NORTH closed between TWY H4 and NORTH 3.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 1.3

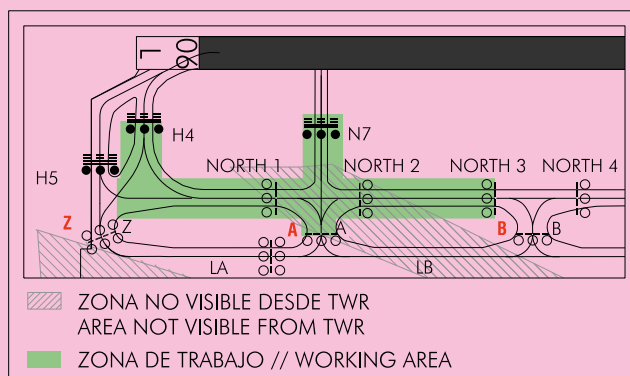

SUBFASE 1.4. Trabajos en puerta B con afección a TWY NORTH.

Horario: Los trabajos se podrán realizar en cualquier horario, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de la puerta B.
- Cierre de TWY NORTH entre NORTH 2 y NORTH 5.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afección puntual.

SUBPHASE 1.4. Works on gate B with impact on TWY NORTH.


Schedule: The works may take place at any time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- Gate B closed.
- TWY NORTH closed between NORTH 2 and NORTH 5.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 1.4

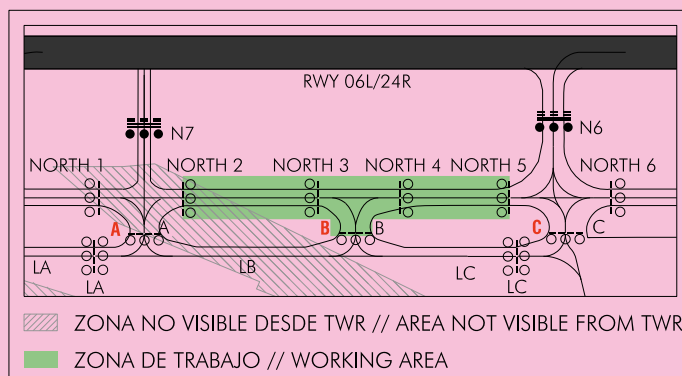

SUBFASE 1.5. Trabajos en puerta C con afección a TWY NORTH.

Horario: Los trabajos se podrán realizar en cualquier horario, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de la puerta C.
- Cierre de TWY N6.
- Cierre de TWY NORTH entre NORTH 4 y NORTH 7.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afección puntual.

SUBPHASE 1.5. Works on gate C with impact on TWY NORTH.


Schedule: The works may take place at any time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- Gate C closed.
- TWY N6 closed.
- TWY NORTH closed between NORTH 4 and NORTH 7.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 1.5

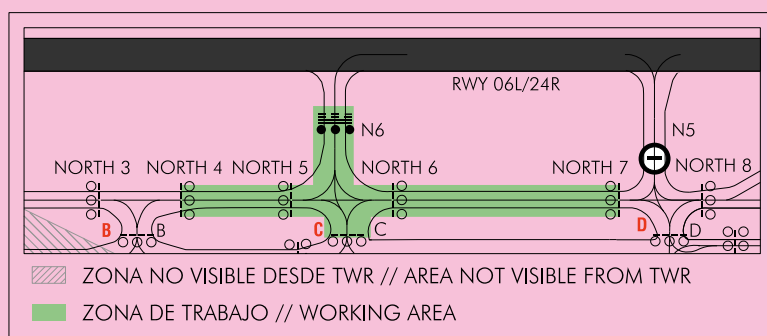

SUBFASE 1.6. Trabajos en puerta D con afección a TWY NORTH.

Horario: Los trabajos se podrán realizar en cualquier horario, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de la puerta D.
- Cierre de TWY N5.
- Cierre de TWY NORTH entre NORTH 6 and NORTH 8.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afección puntual.

SUBPHASE 1.6. Works on gate D with impact on TWY NORTH.


Schedule: The works may take place at any time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- Gate D closed.
- TWY N5 closed.
- TWY NORTH closed between NORTH 6 and NORTH 8.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 1.6

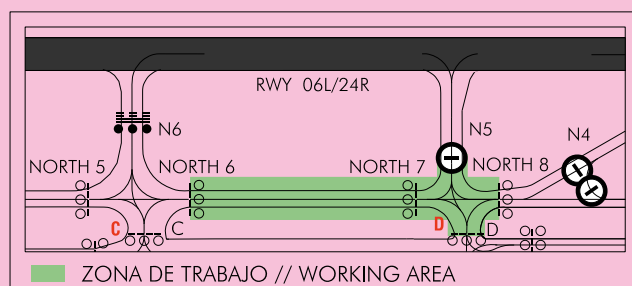

SUBFASE 1.7. Trabajos en salida TWY N4 con afectación a TWY NORTH.

Horario: Los trabajos se podrán realizar en cualquier horario, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de TWY N4.
- Cierre de TWY NORTH entre NORTH 8 y NORTH 9.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afectación puntual.

SUBPHASE 1.7. Works on TWY N4 exit with impact on TWY NORTH.


Schedule: The works may take place at any time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- TWY N4 closed.
- TWY NORTH closed between NORTH 8 and NORTH 9.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 1.7

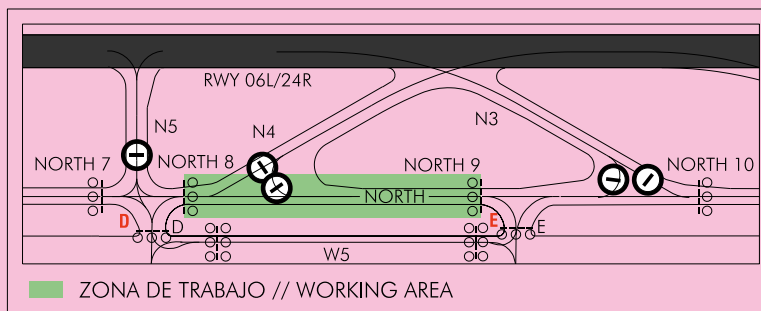

SUBFASE 1.8. Trabajos en puerta E con afectación a TWY NORTH.

Horario: Los trabajos se podrán realizar en cualquier horario, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de la puerta E.
- Cierre de TWY N3.
- Cierre de la NORTH entre NORTH 9 y NORTH 11.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afectación puntual.

SUBPHASE 1.8. Works on TWY N4 exit with impact on TWY NORTH.


Schedule: The works may take place at any time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- Gate E closed.
- TWY N3 closed.
- TWY NORTH closed between NORTH 9 and NORTH 11.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 1.8

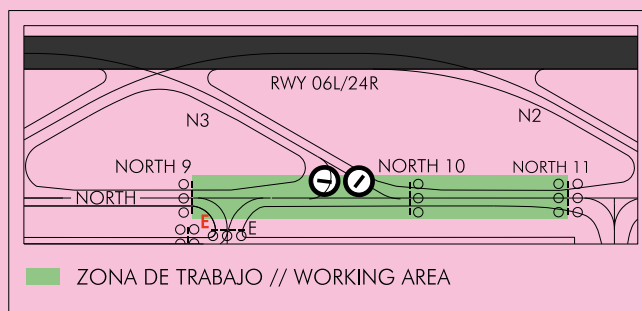

FASE 2. Trabajos en TWY LINK.

Descripción de los trabajos.

Durante esta fase se ejecutarán los trabajos de cambio de balizas halógenas a LED en la TWY LINK.

SUBFASE 2.1. TWY LINK.

Horario: Los trabajos se realizarán en horario nocturno, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de TWY LINK.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afección puntual.

PHASE 2. Works on TWY LINK.

Description of the works.

During this phase, the works to change halogen lamps to LED lamps will be executed on TWY LINK.

SUBPHASE 2.1. TWY LINK.


Schedule: The works may take place at night time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- TWY LINK closed.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 2.1

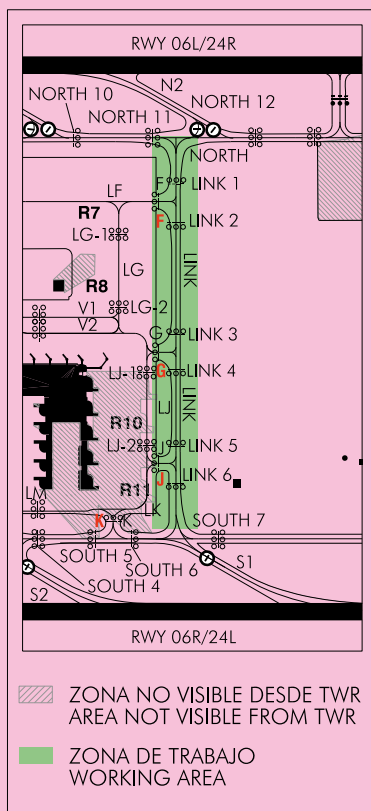

SUBFASE 2.2. Trabajos en puerta F con afección a TWY LINK.

Horario: Los trabajos se podrán realizar en cualquier horario, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierres de la puerta F.
- Cierre de TWY LINK entre TWY NORTH y LINK 3.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afección puntual.

SUBPHASE 2.2. Works on gate F with impact on TWY LINK.


Schedule: The works may take place at any time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- Gate F closed.
- TWY LINK closed between TWY NORTH and LINK 3.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 2.2

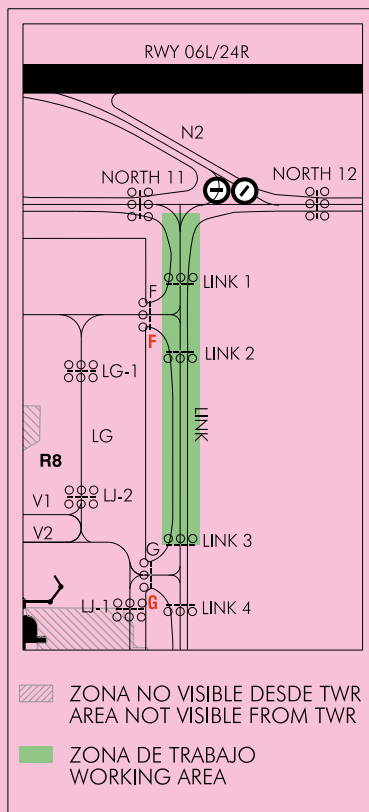

SUBFASE 2.3. Trabajos en puerta G con afección a TWY LINK.

Horario: Los trabajos se podrán realizar en cualquier horario, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de la puerta G.
- Cierre de TWY LINK entre LINK 2 y LINK 5.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afección puntual

SUBPHASE 2.3. Works on gate G with impact on TWY LINK.


Schedule: The works may take place at any time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- Gate G closed.
- TWY LINK closed between LINK 2 and LINK 5.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 2.3

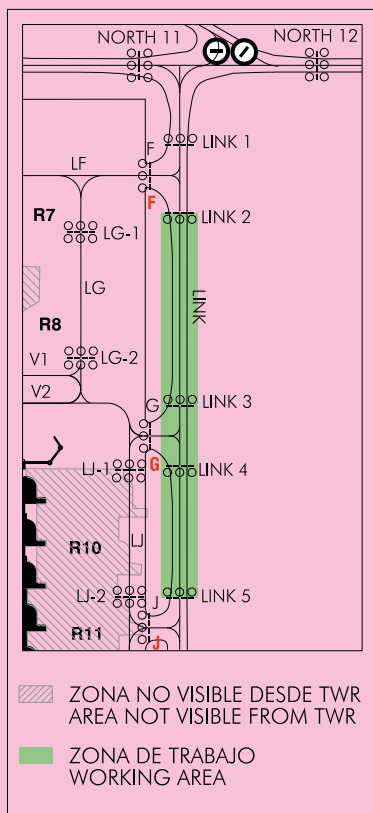

SUBFASE 2.4. Trabajos en puerta J con afección a TWY LINK.

Horario: Los trabajos se podrán realizar en cualquier horario, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de la puerta J.
- Cierre de TWY LINK entre LINK 4 y TWY SOUTH.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afección puntual.

SUBPHASE 2.4. Works on gate J with impact on TWY LINK.


Schedule: The works may take place at any time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- Gate J closed.
- TWY LINK closed between LINK 4 and TWY SOUTH.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 2.4

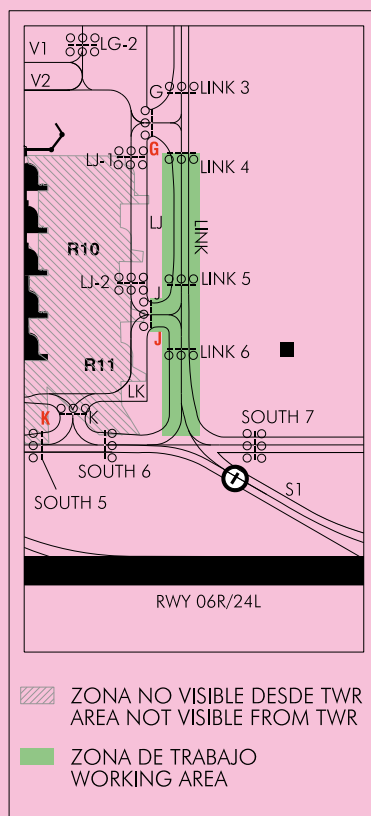

FASE 3. Trabajos en TWY SOUTH.

Descripción de los trabajos.

Durante esta fase se ejecutarán los trabajos de cambio de balizas halógenas a LED en las calles de rodaje de la zona sur, adecuación de basamentos y nivelación de franja de la pista sur (lado norte).

SUBFASE 3.1. Trabajos en pista y TWY SOUTH.

Horario: Los trabajos se podrán realizar en cualquier horario, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de la TWY SOUTH con cierre de RWY 06R/24L.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afección puntual.

PHASE 3: Works on TWY SOUTH.

Description of the works.

During this phase, the works to change halogen lamps to LED technology on the different taxiways of the south area, and plinth compliance and levelling of strip of the South runway (north side).

SUBPHASE 3.1. Works on runway TWY SOUTH.


Schedule: The works may take place at any time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- TWY SOUTH closed with RWY 06R/24L closed.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 3.1

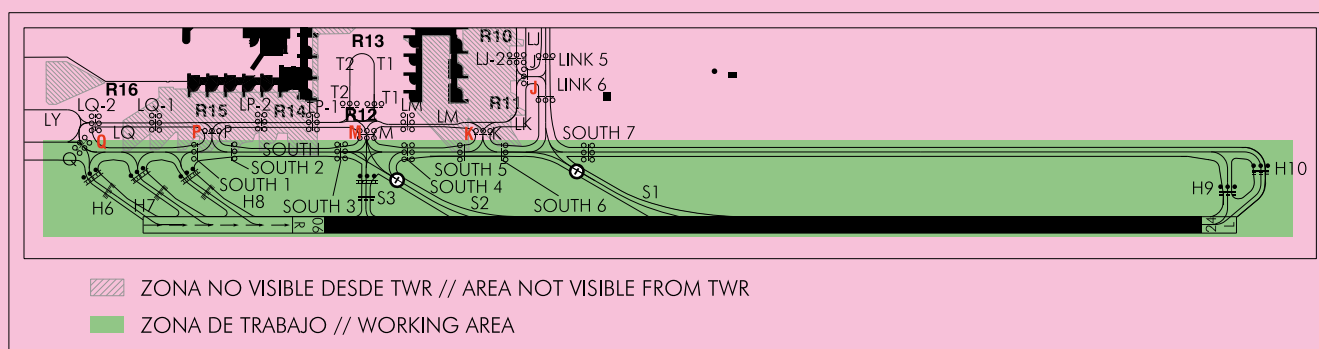

SUBFASE 3.2. Trabajos desde el punto de espera intermedio SOUTH 7 y TWY H10.

Horario: Los trabajos se podrán realizar en cualquier horario, previa coordinación con el aeropuerto.

Restricciones operativas:

- Cierre de TWY SOUTH entre SOUTH 7 y TWY H10.

Se comunicará por NOTAM el inicio y fin de esta afección puntual.

SUBPHASE 3.2. Works from intermediate holding position SOUTH 7 and TWY H10.

Schedule: The works may take place at any time subject to prior coordination with the airport.

Operational restrictions:

- TWY SOUTH closed between SOUTH 7 and TWY H10.

The beginning and end of this temporary impact will be published by NOTAM.

SUBFASE // SUBPHASE 3.2

