

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 07/20
AIRAC 16-JAN-20

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 27-FEB-20 // EFFECTIVE DATE WEF 27-FEB-20

AD

SUP 07/20 **27FEB20/31DEC20EST**
NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

SANTANDER/Seve Ballesteros-Santander AD.- Instalación del sistema de iluminación de aproximación en RWY 29.

Hasta el 31 de diciembre de 2020 estimado, se realizará la instalación del sistema de iluminación de aproximación de precisión categoría I reducido para el aeropuerto SANTANDER/Seve Ballesteros-Santander.

Las fechas de inicio y fin de cada fase, así como cualquier incidencia operativa que se produzca, se anunciarán mediante el correspondiente NOTAM.

La ejecución de las fases no necesariamente deberá realizarse en el orden expuesto. Las fases podrán variar ligeramente o efectuarse de forma conjunta.

Todas las zonas de obra estarán debidamente señalizadas y balizadas en caso necesario.

Se recomienda precaución debido a la posible presencia de personal y maquinaria durante todas las fases.

No se realizarán trabajos cuando estén activados los procedimientos de visibilidad reducida.

SUP 07/20 **27FEB20/31DEC20EST**
NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

SANTANDER/Seve Ballesteros-Santander AD.- Installation of approach lighting system on RWY 29.

Until 31 December 2020 (estimated), the installation of a category I reduced precision approach lighting system will take place at SANTANDER/Seve Ballesteros-Santander Airport.


The start and end dates of each phase, as well as any operational incident that may occur, will be published by NOTAM.

The phases need not necessarily be executed in the order given. The phases may vary slightly or be accomplished simultaneously.

All the working zones will be duly marked and lit when this is necessary.

Caution is recommended due to the possible presence of personnel and machinery during all phases.

When the low visibility procedures are in effect, no works will take place.

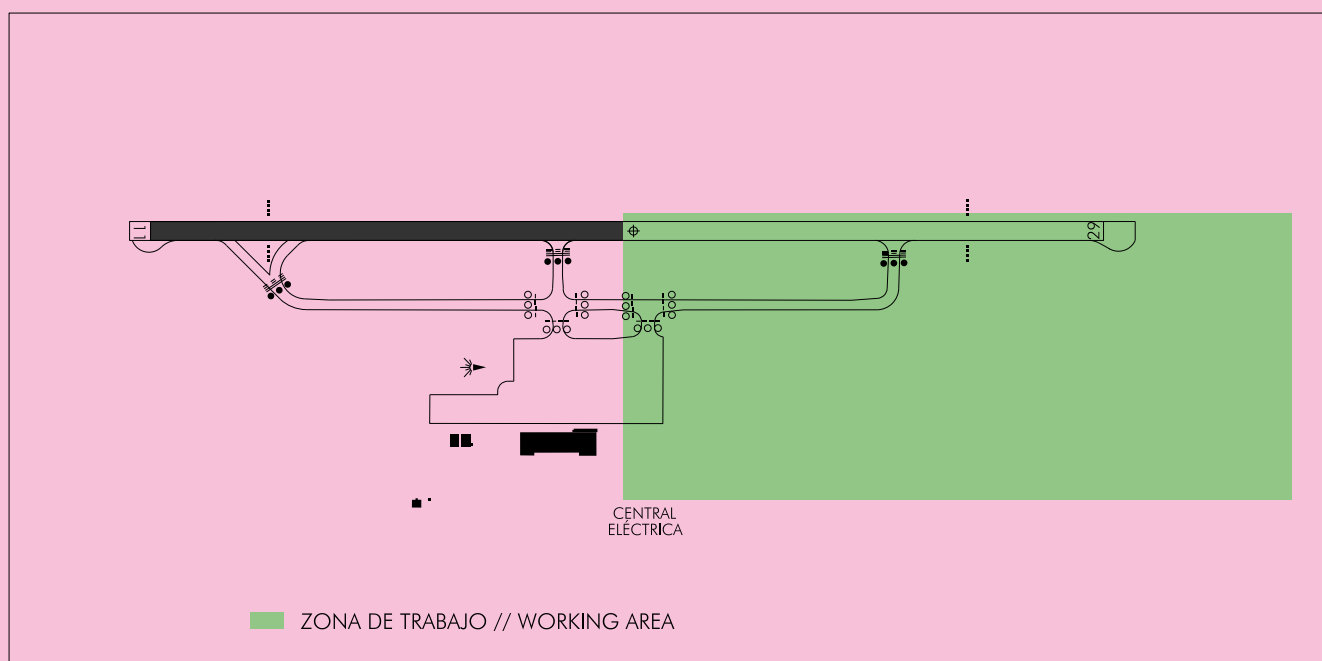


FASE 1. Trabajos previos a la construcción.

Actuaciones: se realizarán trabajos previos y acopio de materiales, maquinaria y casetas de obra necesarias para la ejecución de la obra.

PHASE 1. Prior works for the construction.

Actions: prior works and collection of materials, machinery and work cabins necessary for the execution of the works will be carried out.

FASE // PHASE 1

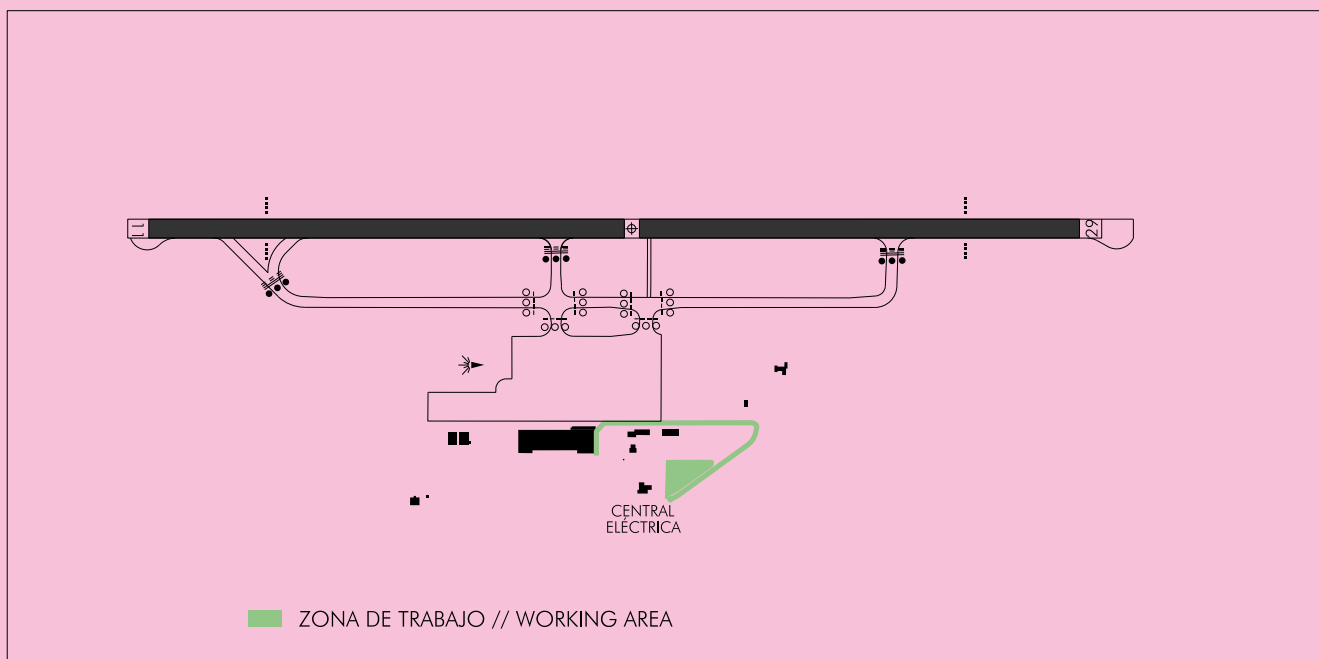

Restricciones operativas: ninguna.

Horario: los trabajos se ejecutarán en horario operativo.

Operational restrictions: none.

Schedule: the works will be executed during operational hours.


FASE 2. Trabajos de construcción de pasarela en la ría para el sistema de aproximación.

Actuaciones: se realizarán trabajos de obra civil para la construcción de la pasarela sobre la ría en la que irá el sistema de iluminación de aproximación.

PHASE 2. Ria bridge construction works for the approach system.

Actions: civil engineering works will be conducted for the construction of the bridge over the ria, where the approach lighting system will be installed.

FASE // PHASE 2

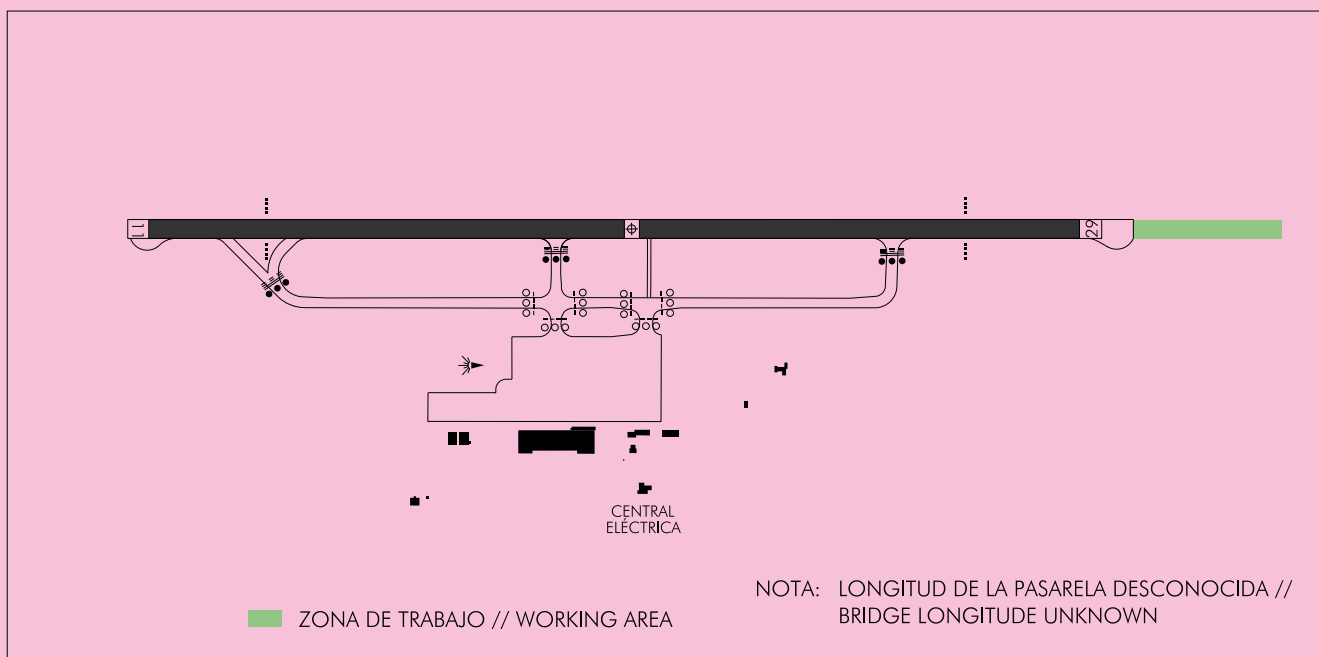

Restricciones operativas: ninguna.

Horario: los trabajos se realizarán en horario no operativo, salvo actuaciones en la zona de acopio de materiales.

Operational restrictions: none.

Hours: the works will be conducted during non-operational hours, except for actions in the material collection zone.


FASE 3. Trabajos de balizamiento en pista para el sistema de aproximación.

Actuaciones: se realizarán los trabajos necesarios de tendido de cableado y de balizas empotradas en cabecera de RWY 29 y pasarela para el nuevo sistema de iluminación de aproximación del aeropuerto.

PHASE 3. Lighting works on runway for the approach system.

Actions: the necessary works for cable laying and inset beacons at the threshold of RWY 29 and the bridge for the new airport approach lighting system will be performed.

FASE // PHASE 3

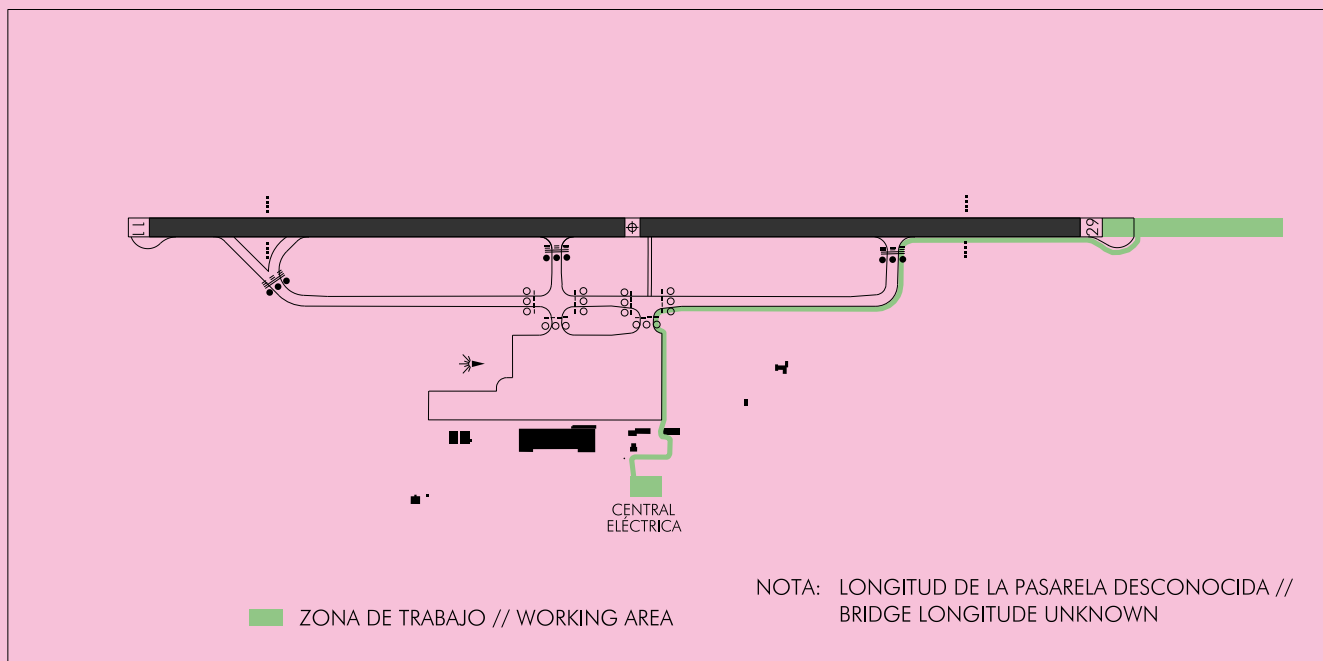

Restricciones operativas: ninguna.

Horario: los trabajos se realizarán en horario no operativo, salvo actuaciones en la zona de acopio de materiales.

Operational restrictions: none.

Hours: the works will be conducted during non-operational hours, except for actions in the material collection zone.


FASE 4. Trabajos en la central eléctrica para conexión del sistema de luces de aproximación.

Actuaciones: se realizarán trabajos eléctricos en la central eléctrica para la integración del nuevo sistema en el balizamiento del aeropuerto.

PHASE 4. Works on the electrical plant to connect the approach lighting system.

Actions: electrical works will be performed on the power plant to integrate the new airport marking system.

FASE // PHASE 4

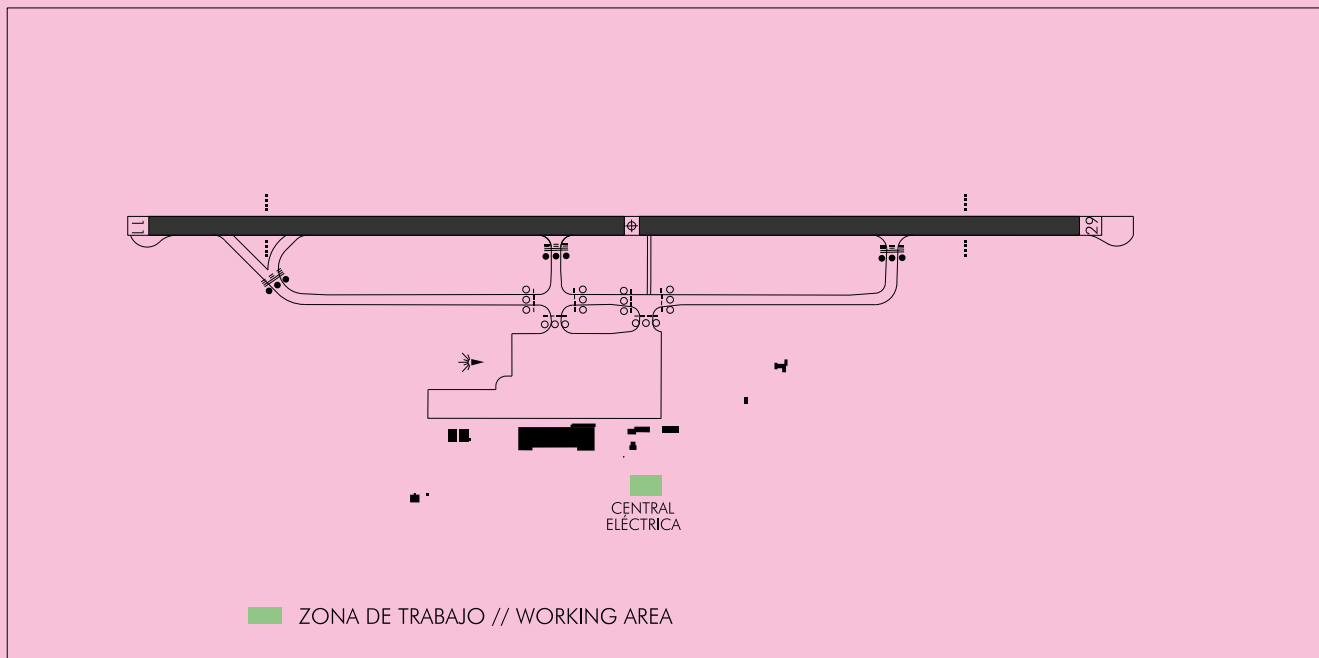

Restricciones operativas: ninguna.

Horario: los trabajos se realizarán en horario operativo.

Operational restrictions: none.

Schedule: the works will be executed during operational hours.
